

目次

1. 工場認定書
2. JIS認定書
3. 配合計画書（溶融スラグ）
 - ①. 配合計画書
 - ②. アルカリ骨材反応抑制対策
 - ③. アルカリ総量計算書
4. 原材料品質証明書
 - ①. セメント
 - ②. 骨材
 - 絶乾密度及び吸水率試験
 - 安定性
 - すりへり試験
 - 粒度試験
 - 粒形判定実績率試験
 - 微粒分量試験
 - 有機不純物試験
 - アルカリシリカ反応性試験
 - 環境安全品質試験
 - 化学分析試験
 - 膨張率試験
 - ③. 水
 - ④. 混和剤料
 - ⑤. 鉄筋
5. コンクリート試験管理表
 - ①. 圧縮強度管理表
 - ②. スランプ管理表
 - ③. 空気量管理表
 - ④. 生コン中の塩化物測定記録
6. 試験機公正証明書
 - ①. 圧縮強度試験機
 - ②. 外圧強度試験機
 - ③. トレーサビリティ体系

1. 工場認定書

工場認定書

田中コンクリート工業株式会社

代表取締役 亀谷太郎 殿

秋田県コンクリート製品協会評価委員会が定めた
認定要領に基づき審査を行った結果 下記工場が
製造品質管理基準を満たしていることを認める

認定番号 ACA-04-1

認定工場 田中コンクリート工業株式会社 東北工場

所在地 秋田県大館市二井田字菖蒲沼28

有効期間 令和7年4月1日～令和8年3月31日

認定日 令和7年4月1日

秋田県コンクリート製品協会

会長 小山雄二

同 評価委員会

委員長 徳重英信

原本と相違ない事を証明します
田中コンクリート工業 東北工場

2. JIS認定書



発効日：2023年8月25日
Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書

田中コンクリート工業株式会社 殿

産業標準化法第30条第1項に基づき、下記のとおり
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

記

認 証 番 号：TC0208075

認証取得者の氏名及び名称：田中コンクリート工業株式会社
住 所：東京都中央区日本橋茅場町 1-1-8

鉱工業品の名称：プレキャスト鉄筋コンクリート製品

認証に係る JIS 番号：JIS A 5372

認 証 の 区 分：I類

工場及び事業所の名称：田中コンクリート工業株式会社 東北工場
所 在 地：秋田県大館市二井田字菖蒲沼 28

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については
日本産業規格適合性認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2008年8月25日
有 効 期 限：2026年8月24日

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業株式会社
東北工場



一般財団法人 建材試験センター
Japan Testing Center for Construction Materials
東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号

理事長 渡辺 宏





Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書附属書

(認証番号:TC0208075)

認証の範囲(種類又は等級) :

プレキャスト鉄筋コンクリート製品 I 類

製品の種類	製品
路面排水溝類	落ちふた式U形側溝
用排水路類	フリューム

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 32mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC0208075」を表示する。
- 3) 日本産業規格の種類及び呼びの略号を表示する。

付記事項の表示 : 鉱工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・製造工場名又は略号
- ・製造年月日又は略号

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1 製品ごとに押印する。
- 2) 容易に消えない方法による。

原本と相違ない事を証明します。
田中コンクリート工業(株)東北工場



一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者

丸山 慶一郎



3. 配合計画書（溶融スラグ）

- ①. 配合計画書
- ②. アルカリ骨材反応抑制対策
- ③. アルカリ総量計算書

振動流し込み製品

コンクリートの示方配合表

コンクリートの配合種類 スラグ

コンクリートの圧縮強度 設計基準強度 30N/mm²

セメントの種類	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ の範囲 (cm)	空気量 (%)	水セメント 比 W/C (%)	細骨材率 S/a (%)	単位量 (kg/m ³)					
						水 W	セメント C	細骨材 S1	スラグ S2	粗骨材 G	混和剤 AE
普通	20	8.0±2.5	4.5±1.5	43.5	38.5	157	361	508	187	1145	1.81

※ コンクリート中の塩化物総量は、0.3kg/m³(Cl-) 以下
測定器カンタブ(=塩測第860202号)とする

※ 溶融スラグの配合率: 細骨材全体の25%(質量比)

使用材料規格

セメント	項目 種類	比表面積 (cm ² /g)	凝結		安定性	圧縮強度(N/mm ²)				化学成分(%)				
			始発 (h-m)	終結 (h-m)		1d	3d	7d	28d	酸化マグ ネシウム	三酸化 硫黄	強熱減量	全 アルカリ	酸化物 イオン
	普通 ポルトランド	2500以上	60m以上	10h以下	良	—	12.5以上	22.5以上	42.5以上	5.0以下	3.5以下	5.0以下	0.75以下	0.035以下
メーカー : UBE三菱セメント 株式会社														

種類			寸法	ふるいを通るものの質量百分率(%)										
				25	20	15	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	
骨	粒	度	細	砂	—	—	—	100	90～100	80～100	50～90	25～65	10～35	2～10
			細	溶融スラグ	—	—	—	100	90～100	80～100	50～90	25～65	10～35	2～10
			粗	砕石	100	90～100	—	20～55	0～10	0～2.5	—	—	—	—
材	品	質	種類	項目	絶対密度 (g/cm ³)	吸水率 (%)	単位容積 質量(kg/ℓ)	実績率 (%)	粒径判定 実績率(%)	微粒分量 (%)	有機不純物		安定性 (%)	スリヘリ 減量(%)
			細	砂	2.5以上	3.5以下	—	—	—	1.5±1.0	標準色より淡い		10以下	—
			細	溶融スラグ	2.5以上	3.0以下	—	—	53以上	7%以下	標準色より淡い		10以下	—
			粗	砕石	2.5以下	3.0以下	1.50以上	55以上	56以上	2.0±1.0	—		12以下	40以下
			産地　　： 細骨材(砂・山本郡八峰町峰浜)、(溶融スラグ・秋田市総合環境センター)											

混和剤	種類	品名	外観	比重	減水率	ブリージング量の比
	AE減水剤標準型Ⅰ種	ヤマソー90SE	暗褐色液体	1.16~1.20	10以上	70以下
製造元: 山宗化学 株式会社						

鉄線	コンクリート用鉄線	線 径 (mm)	2.60	3.20	4.00	5.00	6.00
	SWM-P	許容差 (mm)	±0.06	±0.08		±0.10	
	JIS G 3532	引張強さ(N/mm ²)	540以上				
	メーカー : 青森昭和産業 株式会社						

鉄筋 コンクリート用棒鋼	項目 種類	呼び名 (mm)	許容差 (mm)	降伏点 (N/mm ²)	引張り強さ (N/mm ²)	伸び (%)	曲げ試験
	熱間圧延丸鋼 SR235 JIS G 3112	9 13 16 19	JIS G 3112 に適合 すること	235以上	380～520	20以上 (2号試験片)	曲げ角度は180° 常温で 曲げて、外観に亀裂を生 じてはならない。
熱間圧延丸鋼 SD295 JIS G 3112	D6 D10 D13 D16 D19	295以上		440～600	16以上 (2号試験片)		
メーカー：青森昭和産業 株式会社 製造元：北越メタル株式会社、株式会社 伊藤製鐵所							

原本と相違ない事を証明します。

田中コンクリート工業(株)



アルカリ骨材反応抑制対策について

JIS A 5308 付属書B(規定)アルカリシリカ反応抑制対策の方法 B.2 区分の3項の対策のうち、何れか1つにて確認頂くことになっております。

- a) コンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策
- b) アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメントなどを使用する抑制対策
- c) 安全と認められる骨材を使用する抑制対策

上記により、当工場では、a)「コンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策」にて管理し対策を講じていることをご報告致します。

原本と相違ない事を証明します
田中コンクリート工業(株)
東北工場



田中コンクリート工業株式会社
東北工場

コンクリート中のアルカリ総量計算

令和 7 年 8 月

1 配合 (示方配合による)

工場長	QCM	係
		

配合の種類	セメントの種類	単位量 (kg/m ³)					
		水 W	セメント C	細骨材 S1	スラグ S2	粗骨材 G	混和剤 AE
スラグ	普通	157	361	508	187	1145	1.81

2 材料中の全アルカリ量 (Na₂O換算値:試験成績表による) 及び骨材中の塩化物量

試験月 種類	8 月分	7 月分	6 月分	5 月分	4 月分	3 月分	6ヶ月間の最大値
普通セメント	0.60	0.57	0.55	0.50	0.53	0.54	0.60 ✓

項目 材料名	セメント	細骨材(S1)	細骨材(S2)	混和材	混和剤	流動化剤
全アルカリ量	0.6	—	—	—	3.5	—
塩化物量(NaCl)	—	0.001	0.001	—	—	—

※ セメントは直近6ヶ月間の最大値の値

※ セメント以外は最新の試験成績表に示される値

計 算 式		計 算 結 果
コンクリート中のセメントに含まれるアルカリ量 (kg/m ³) ① Rc = (単位セメント量 × (セメント中の全アルカリ量 ÷ 100)) $= 361 \times \frac{0.6}{100}$		①=Rc 2.166
コンクリート中の混和材に含まれるアルカリ量 (kg/m ³) ② Ra = 単位混和材量 × (混和材中の全アルカリ量 ÷ 100)		②=Ra —
コンクリート中の骨材(細骨材)に含まれるアルカリ量 (kg/m ³) ③ Rs = 単位骨材量(細骨材S1) × 0.53 × (骨材中のNaClの量 ÷ 100) + 単位骨材量(細骨材S2) × 0.53 × (骨材中のNaClの量 ÷ 100) $= 508 \times 0.53 \times \frac{0.001}{100} + 187 \times 0.53 \times \frac{0.001}{100}$		③=Rs 0.0037
コンクリート中の混和剤に含まれるアルカリ量 (kg/m ³) ④ Rm = 単位混和剤量 × (混和剤中の全アルカリ量 ÷ 100) $= 1.81 \times \frac{3.5}{100}$		④=Rm 0.0634
流動化剤を添加する場合は、コンクリート中の流動化剤に含まれるアルカリ量 (kg/m ³) ⑤ Rp = 単位流動化剤量 × (流動化剤中の全アルカリ量 ÷ 100)		⑤=Rp —
コンクリート中のアルカリ総量 (kg/m ³) Rt = ①+②+③+④+⑤	判定基準 Rt = 3.0 kg/m ³ 以下	Rt 2.2330 ≒ 2.2 ✓
判定		3.0 kg/m ³ 以下なので 適 否

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場

田中コンクリート工業(株) 東北工場

4. 原材料品質証明書

①. セメント

②. 骨材

絶乾密度及び吸水率試験

安定性

すりへり試験

粒度試験

粒形判定実績率試験

微粒分量試験

有機不純物試験

アルカリシリカ反応性試験

環境安全品質試験

化学分析試験


膨張率試験

③. 水

④. 混和剤料

⑤. 鉄筋

セメント試験成績表



2025 年 8 月度

UBE三菱セメント株式会社

種 類 品質		普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高炉セメント B種 JIS R 5211			
		JIS 規格値	試 験 成 績			JIS 規格値	試 験 成 績			JIS 規格値	試 験 成 績		
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密 度	g/cm ³	—	3.16	—	—	—	3.14	—	—	—	3.04	—	—
比表面積	cm ² /g	2500以上	3230	76	—	3300以上	4610	82	—	3000以上	3970	83	—
凝 結	水 量 %	—	28.4	—	—	—	30.4	—	—	—	30.4	—	—
	始 発 h-min	60min以上	2-16	—	(1-50)	45min以上	1-43	—	(1-10)	60min以上	2-54	—	(2-40)
	終 結 h-min	10h以下	3-20	—	4-30	10h以下	2-47	—	3-20	10h以下	4-02	—	5-10
安定性	バット法	良	良	—	—	良	良	—	—	良	良	—	—
圧縮強さ N/mm ²	1 d	—	—	—	—	10.0以上	27.7	1.46	—	—	—	—	—
	3 d	12.5以上	31.6	1.66	—	20.0以上	49.4	1.69	—	10.0以上	23.4	1.45	—
	7 d	22.5以上	46.7	1.79	—	32.5以上	62.3	1.86	—	17.5以上	37.1	1.69	—
	28 d	42.5以上	63.4	1.86	—	47.5以上	70.5	1.95	—	42.5以上	62.6	1.81	—
水和熱 J/g	7 d	—	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28 d	—	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化学成分 %	酸化マグネシウム	5.0以下	1.39	—	2.52	5.0以下	1.02	—	1.29	6.0以下	3.17	—	3.89
	三酸化硫黄	3.5以下	2.40	—	2.64	3.5以下	2.90	—	3.06	4.0以下	2.17	—	2.28
	強 熱 量	5.0以下	2.61	—	2.94	5.0以下	1.22	—	1.58	5.0以下	1.78	—	2.08
	全アルカリ	0.75以下	0.50	—	0.60	0.75以下	0.44	—	0.62	—	—	—	—
	塩化物イオン	0.035以下	0.019	—	0.027	0.02以下	0.011	—	0.016	—	0.011	—	—

備 考 ○ ポルトランドセメント (全アルカリの最大値のうち直近6ヶ月の最大の値)

- ・普通ポルトランドセメント…………… 0.60%
- ・早強ポルトランドセメント…………… 0.62%

原本と相違ない事を証明します

○ 高炉セメント B種

- ・ベースセメントの全アルカリ…………… 0.50%
- ・高炉スラグの分量…………… 40～45%

田中コンクリート工業(株)

東北工場

1. 試験方法は JIS R 5201, JIS R 5202, JIS R 5203, JIS R 5204 による。
2. 28d圧縮強さおよび28d水和熱は前月度の値を示す。

◎ お問い合わせその他のご連絡先

〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-1-25

JRE東二番丁スクエア12F

UBE三菱セメント株式会社
東北支店

TEL 022-711-5714



細骨材試験成績表

工場長	QCM	担当
		

令和 7 年 8 月 度

骨材の種類	砂
骨材の産地	秋田県山本郡八峰町峰浜

細骨材の密度・吸水率試験				JIS A 1109
実施日	令和 7 年 8 月 5 日	火曜日	天候	雨
温度・湿度	室温	湿度	水槽の水温	乾燥機の温度
	32℃	72%	20℃	105℃
測定番号		1	2	
①500mlの目盛まで水を満たしたフラスコの質量	(g)	672.1	652.4	
②密度試験用試料の質量	(g)	500.0	500.0	
③試料と水で500mlの目盛まで満たしたフラスコの質量	(g)	977.3	957.5	
④水の温度	(℃)	20	20	
⑤水の密度	(g/cm³)	0.9982	0.9982	
⑥表乾密度 (②*⑤)/(①+②-③)	(g/cm³)	2.562	2.561	
⑦平均値	(g/cm³)	2.56	(2.562)	✓
平均値からの差	0.01g/cm³以下	0.00	0.00	
⑧合否判定	2.58±0.02g/cm³	合格		✓
⑨表面乾燥飽水状態の吸水率試験用試料の質量	(g)	500.0	500.0	
⑩乾燥後の吸水率試験用試料の質量	(g)	492.3	492.7	
⑪吸水率 (⑨-⑩)/⑩*100	(%)	1.564	1.482	
⑫平均値	(%)	1.52	(1.523)	✓
平均値からの差	0.05%以下	0.04	0.04	
⑬合否判定	3.0%以下	合格		✓
⑭絶乾密度 ⑥*(⑩/⑨)	(g/cm³)	2.535	2.522	
⑮平均値	(g/cm³)	2.53	(2.529)	✓
平均値からの差	0.01g/cm³以下	0.01	0.01	
⑯合否判定	2.5g/cm³以上	合格		✓

細骨材の微粒分量試験				JIS A 1103
実施日	令和 7 年 8 月 6 日	水曜日	天候	曇り
測定番号		1	2	
①試験前の試料の乾燥質量	(g)	500.0	500.0	
②試験後の試料の乾燥質量	(g)	490.3	490.8	
③網フルイ0.075mmを通過する量 (①-②)/①*100	(%)	1.94	1.84	
④平均値	(%)	1.9	(1.89)	✓
平均値からの差	0.5%以下	0.1	0.1	
⑤合否判定	3.5%以下	合格		✓

粘土塊量試験				JIS A 1137
実施日	令和 7 年 8 月 7 日	木曜日	天候	雨
測定番号		1	2	
①試験前の試料の乾燥質量	(g)	500.0	500.0	
②試験後の試料の乾燥質量	(g)	499.5	499.4	
③粘土塊量 (①-②)/①*100	(%)	0.10	0.12	
⑤平均値	(%)	0.1	(0.11)	✓
平均値からの差	0.2%以下	0.0	0.0	
⑤合否判定	1.0%以下	合格		✓

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場

田中コンクリート工業 (株) 東北工場

細骨材試験成績表

(溶融スラグ)

工場長	QCM	担当
		

令和 7 年 8 月度

骨材の種類	細骨材 (溶融スラグ)
骨材の産地	秋田市総合環境センター

細骨材の密度・吸水率試験					JIS A 1109
実施日	令和 7 年 8 月 5 日	火曜日	天候	雨	
温度・湿度	室温 32℃	湿度 72%	水槽の水温 20℃	乾燥機の温度 105℃	
測定番号		1	2		
①500mlの目盛まで水を満たしたフラスコの質量	(g)	673.4	679.8		
②密度試験用試料の質量	(g)	500.0	500.0		
③試料と水で500mlの目盛まで満たしたフラスコの質量	(g)	992.5	999.6		
④水の温度	(℃)	20	20		
⑤水の密度	(g/cm³)	0.9982	0.9982		
⑥表乾密度 (②*⑤)/(①+②-③)	(g/cm³)	2.759	2.77		
⑦平均値	(g/cm³)	2.76	(2.765)	✓	
平均値からの差	0.01g/cm³以下	0.01	0.01		
⑧合否判定	2.83g/cm³ ±0.10	合格	✓		
⑨表面乾燥飽水状態の吸水率試験用試料の質量	(g)	500.0	500.0		
⑩乾燥後の吸水率試験用試料の質量	(g)	498.2	497.8		
⑪吸水率 (⑨-⑩)/⑩*100	(%)	0.361	0.442		
⑫平均値	(%)	0.4	(0.402)	✓	
平均値からの差	0.05%以下	0.04	0.04		
⑬合否判定	3.0%以下	合格	✓		
⑭絶乾密度 ⑥*(⑩/⑨)	(g/cm³)	2.749	2.758		
⑮平均値	(g/cm³)	2.75	(2.754)	✓	
平均値からの差	0.01g/cm³以下	0.01	0.00		
⑯合否判定	2.5g/cm³以上	合格	✓		

細骨材の微粒分量試験					JIS A 1103
実施日	令和 7 年 8 月 6 日	水曜日	天候	曇り	
測定番号		1	2		
①試験前の試料の乾燥質量	(g)	500.0	500.0		
②試験後の試料の乾燥質量	(g)	484.2	485.1		
③網フルイ0.075mmを通過する量 (①-②)/①*100	(%)	3.16	2.98		
④平均値	(%)	3.1	(3.07)	✓	
平均値からの差	0.5%以下	0.1	0.1		
⑤合否判定	3.0% ±2.0	合格	✓		

粒形判定実績率					JIS A 5005
実施日	令和 7 年 8 月 7 日	木曜日	天候	雨	
測定番号		1	2		
①マスの容積	(ℓ)	1.992	1.992		
②マスの質量	(kg)	1.096	1.096		
③試料+マスの質量	(kg)	4.091	4.099		
④単位容積質量 (③-②)/①	(kg/ℓ)	1.504	1.508		
⑤平均値	(kg/ℓ)	1.51	(1.506)		
平均値からの差	0.01kg/ℓ以下	0.00	0.00		
⑥実績率 ④/絶乾密度*100	(%)	54.71	54.68		
⑦平均値	(%)	54.7	(54.70)	✓	
⑧合否判定	53%以上	合格	✓		

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場

田中コンクリート工業 (株) 東北工場

粗骨材試験成績表

工場長	QCM	担当
		

令和 7 年 8 月度

骨材の種類	砕石2005
骨材の産地	秋田県大館市粕田

粗骨材の密度・吸水率試験					JIS A 1110	
実施日	令和 7 年 8 月 5 日	火曜日	天候	雨		
温度・湿度	室温	湿度	水槽の水温	乾燥機の温度		
	32℃	72%	20℃	105℃		
測定番号			1	2		
①表乾状態の試料の質量	(g)		2529.6	2529.3		
②水中のカゴと試料の質量	(g)		1966.5	1965.4		
③水中のカゴの質量	(g)		359.5	359.6		
④水の温度	(℃)		20	20		
⑤水の密度	(g/cm³)		0.9982	0.9982		
⑥表乾密度 (①*⑤)/(①-②+③)	(g/cm³)		2.737	2.734		
⑦平均値	(g/cm³)		2.74	(2.736)	✓	
平均値からの差	0.01g/cm³以下		0.00	0.00		
⑧合否判定	2.72±0.02g/cm³		合格		✓	
⑨乾燥後の試料の質量	(g)		2488.6	2487.6		
⑩吸水率 (①-⑨)/⑨*100	(%)		1.648	1.676		
⑪平均値	(%)		1.66	(1.662)	✓	
平均値からの差	0.03%以下		0.01	0.01		
⑫合否判定	3%以下		合格		✓	
⑬絶乾密度 (⑨*⑤)/(①-②+③)	(g/cm³)		2.693	2.689		
⑭平均値	(g/cm³)		2.69	(2.691)	✓	
平均値からの差	0.01g/cm³以下		0.00	0.00		
⑮合否判定	2.5g/cm³以上		合格		✓	

粗骨材の微粒分量試験					JIS A 1103	
実施日	令和 7 年 8 月 6 日	水曜日	天候	曇り		
測定番号			1	2		
①試験前の試料の乾燥質量	(g)		2523.6	2522.4		
②試験後の試料の乾燥質量	(g)		2521.4	2519.6		
③網フルイ0.075mmを通過する量 (①-②)/①*100	(%)		0.087	0.111		
④平均値	(%)		0.10	(0.099)	✓	
平均値からの差	0.5%以下		0.0	0.0		
⑤合否判定	3.0%以下		合格		✓	

粒形判定実績率					JIS A 5005	
実施日	令和 7 年 8 月 7 日	木曜日	天候	雨		
測定番号			1	2		
①マスの容積	(ℓ)		10.003	10.003		
②マスの質量	(kg)		4.008	4.008		
③試料+マスの質量	(kg)		20.224	20.211		
④単位容積質量 (③-②)/①	(kg/ℓ)		1.621	1.620		
⑤平均値	(kg/ℓ)		1.62	(1.621)		
平均値からの差	0.01kg/ℓ以下		0.00	0.00		
⑥実績率 ④/絶乾密度*100	(%)		60.19	60.25		
⑦平均値	(%)		60.2	(60.22)	✓	
⑧合否判定	56%以上		合格		✓	

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場

田中コンクリート工業 (株) 東北工場

試験規格		硫酸ナトリウムによる細骨材の安定性試験表				
JIS A 1122:2014						
試験年月日		令和 6 年11月18日 ～11月23日				
試験実施場所		技術研修センター 試験室・恒温室				
試 料	No.	S-15336				
	工場名	田中コンクリート工業株式会社 東北工場				
	種類	砂				
	産地	山本郡八峰町峰浜沼田字ホナン沼端4-6				
	採取月日	令和 6 年11月13日				
とどまる ふるい	通るふるい	各群の 質量分率	試験前の各 群の質量	試験後の各 群の質量	各群の損失 質量分率	骨材の損失 質量分率
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)
—	0.075	0	—	—	—	—
0.075	0.15	2	—	—	—	—
0.15	0.3	20	—	—	—	—
0.3	0.6	29	100.0	98.4	1.6	0.5
0.6	1.2	16	100.0	98.2	1.8	0.3
1.2	2.5	14	100.0	98.4	1.6	0.2
2.5	5	15	100.0	97.4	2.6	0.4
5	10	4			2.6	0.1
合 計		100				1.5 ✓

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

以上

原本と相違ない事を証明します
田中コンクリート工業株式会社
東北工場



工場長	QCM	係

24G15337-3/3頁

試験規格		硫酸ナトリウムによる粗骨材の安定性試験表				
JIS A 1122:2014						
試験年月日		令和 6 年11月18日～11月23日				
試験実施場所		技術研修センター 試験室・恒温室				
試 料	No.	G-15337				
	工場名	田中コンクリート工業株式会社 東北工場				
	種類	碎石 2005				
	産地	大館市粕田				
	採取月日	令和 6 年11月12日				
とどまる ふるい	通るふるい	各群の 質量分率	試験前の各 群の質量	試験後の各 群の質量	各群の損失 質量分率	骨材の損失 質量分率
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)
5	10	39	300	287	4.3	1.7
10	15	51	502	474	5.6	2.9
15	20	10	751	707	5.9	0.6
20	25	0			5.9	0.0
25	40					
合 計		100				5.2 ✓

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

以上



工場長	QCM	係

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場

24G15337-2/3頁

試験規格		ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験表	
JIS A 1121 : 2022			
試験年月日		令和 6 年 11 月 18 日	
試験実施場所		技術研修センター 試験室・ロサンゼルス室	
試 料	No.	G-15337	
	工場名	田中コンクリート工業株式会社 東北工場	
	種類	碎石 2005	
	産地	大館市粕田	
	採取月日	令和 6 年 11 月 12 日	
とどまるふるい	通るふるい	各群の質量分率	試験前の各群の質量
(mm)	(mm)	(%)	(g)
60	80		
50	60		
40	50		
25	40		
20	25	0	
15	20	10	
10	15	51	2502
5	10	39	2500
2.5	5	0	
—	2.5	0	
合	計	100	5002
試験前の試料の質量 : m_1		(g)	5002
粒度区分			C
球の数		(個)	8
球の全質量		(g)	3341
試験後 1.7 mm ふるいに残った質量 : m_2		(g)	4402
すりへり減量 : R		(%)	12.0 ✓
備 考			

原本と相違ない事を証明します 秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

田中コンクリート工業株式会社

東北工場



細骨材のふるい分け試験


工場長	QCM	担当
		

試験年月日： 令和 7 年 8 月 5 日

種 類	砂
産 地	秋田県山本郡八峰町峰浜
最大寸法	5.0(mm)
試料の採取場所	工場細骨材ヤード
試料の採取日	令和7年8月4日
ふるい分け前の試料の質量	502.9 (g)
ふるい分け方法	手動

ふるいの呼び寸法(mm)	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	>	合 計
各ふるいの残留量(g)	0	6.4	48.6	68.1	135.5	159.2	74.5	9.6	501.9
各ふるいの残留率(%)	0	1.3	9.7	13.6	27.0	31.7	14.8	1.9	100
累積残留率(%)	0	1	11	25	52	83	98	100	
ふるい通過率(%)	100	99	89	75	48	17	2	0	
粒度範囲(%)	100	90~100	80~100	50~90	25~65	10~35	2~10		

項 目	規 格 値	実 測 値	判 定
試料質量差	1%未満	0.2 ✓	合 ✓
粗粒率(FM)	2.70±0.15	2.70 ✓	合 ✓

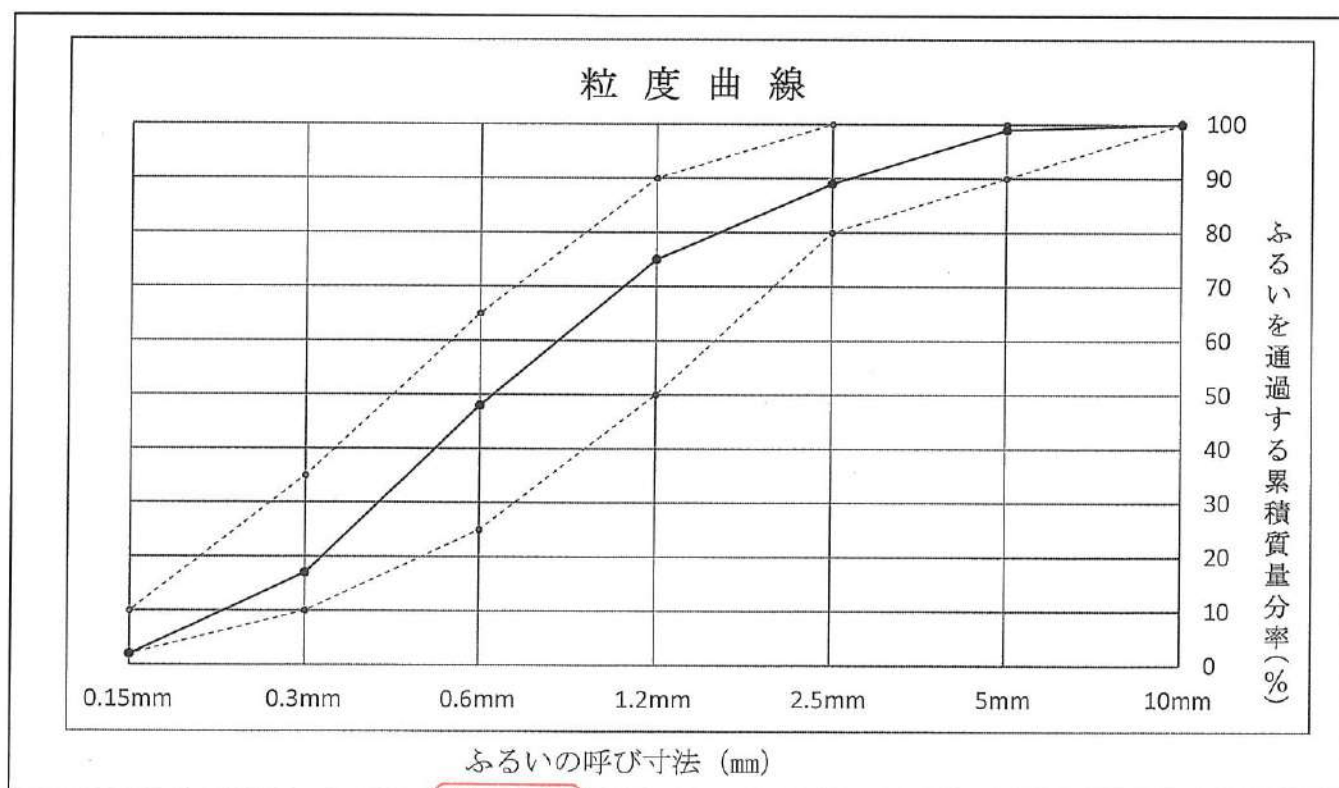

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業株式会社

東北工場

田中コンクリート工業株式会社 東北工場

細骨材のふるい分け試験


工場長	QCM	担当
		

試験年月日： 令和 7 年 8 月 5 日

種 類	熔融スラグ
産 地	秋田市総合環境センター
最大寸法	5.0(mm)
試料の採取場所	工場スラグ骨材ヤード
試料の採取日	令和7年8月4日
ふるい分け前の試料の質量	501.1 (g)
ふるい分け方法	手動

ふるいの呼び寸法(mm)	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	>	合 計
各ふるいの残留量(g)	0	0	0.0	58.7	256.3	123.9	45.7	15.9	500.5
各ふるいの残留率(%)	0	0	0	11.7	51.2	24.8	9.1	3.2	100
累積残留率(%)	0	0	0	12	63	88	97	100	
ふるい通過率(%)	100	100	100	88	37	12	3	0	
粒度範囲(%)	100	90~100	80~100	50~90	25~65	10~35	2~15		

項 目	規 格 値	実 測 値	判 定
試料質量差	1%未満	0.1 ✓	合 ✓
粗粒率(FM)	2.60±0.20	2.60 ✓	合 ✓

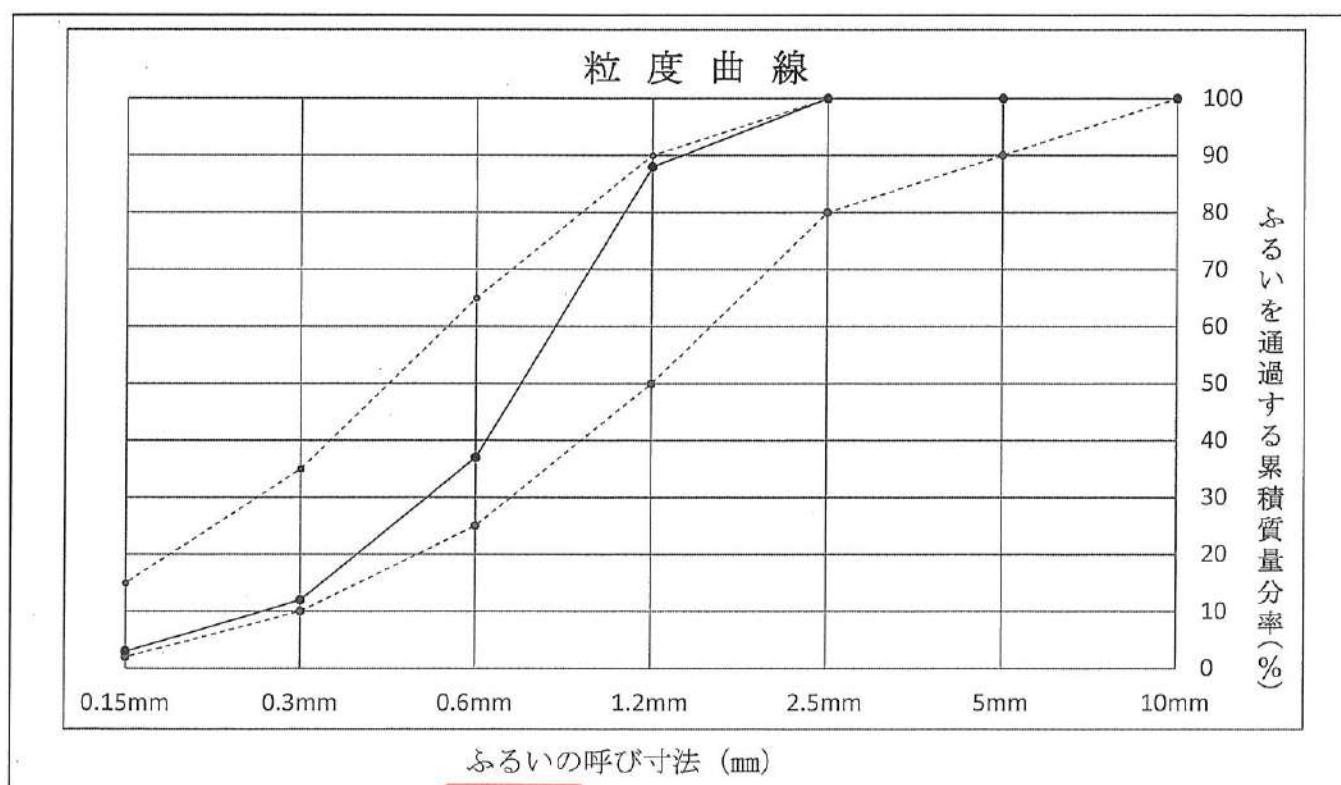

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業株式会社

東北工場

田中コンクリート工業株式会社 東北工場

粗骨材のふるい分け試験


工場長	QCM	担当
		

試験年月日： 令和 7 年 8 月 5 日

種 類	砕石2005
産 地	秋田県大館市粕田
最大寸法	20.0 (mm)
試料の採取場所	工場粗骨材ヤード
試料の採取日	令和7年8月4日
ふるい分け前の試料の質量	5020 (g)
ふるい分け方法	手動

ふるいの呼び寸法(mm)	30	25	20	15	10	5	2.5	>	合 計
各ふるいの残留量(g)		0	104	1,260	2,278	1,167	131	59	4,999
各ふるいの残留率(%)		0	2.1	25.2	45.6	23.3	2.6	1.2	100
累積残留率(%)		0	2	27	73	96	99	100	
ふるい通過率(%)		100	98	73	27	4	1	0	
粒度範囲(%)		100	90~100		20~55	0~10	0~5		

項 目	規 格 値	実 測 値	判 定
試料質量差	1%未満	0.4 ✓	合 ✓
粗粒率 (FM)	6.68±0.20	6.70 ✓	合 ✓

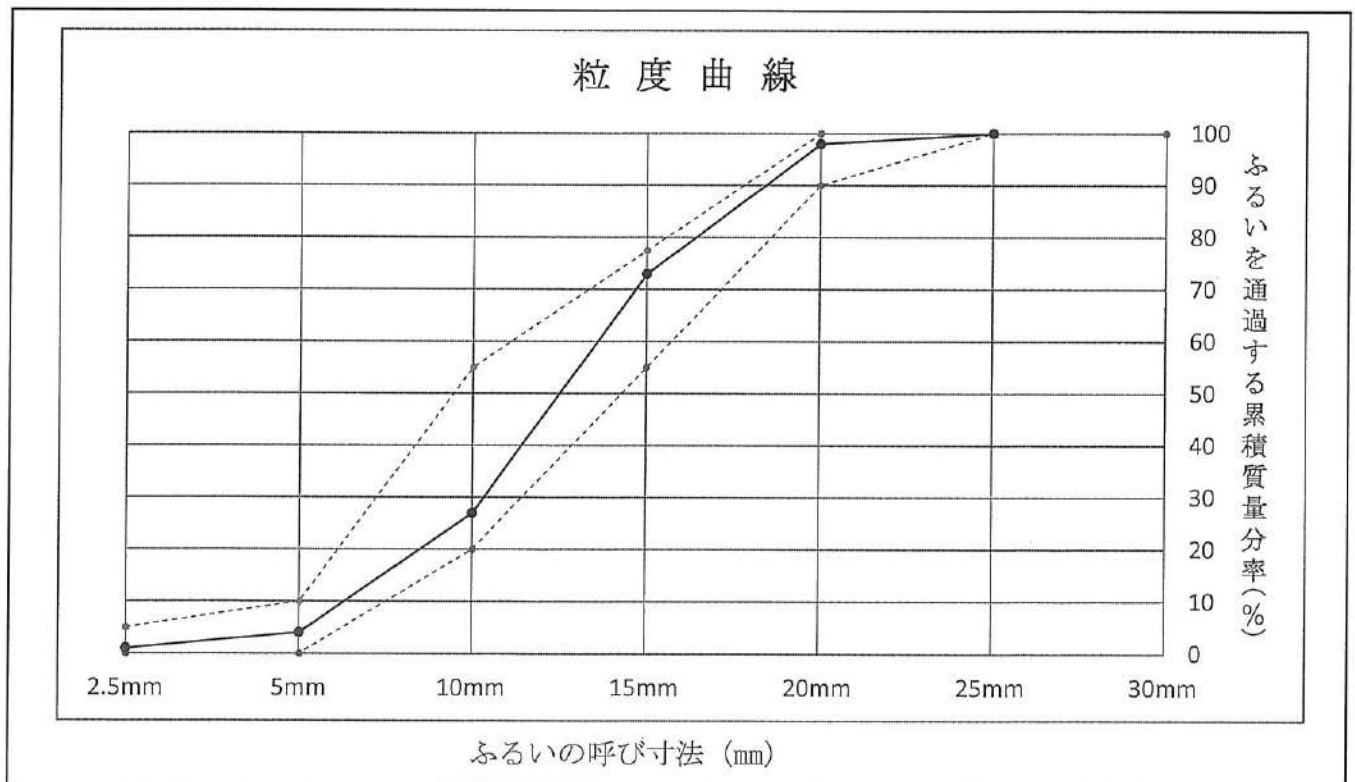

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場

田中コンクリート工業株式会社 東北工場

細 骨 材 の 試 験 結 果 報 告 書

田中コンクリート工業株式会社 東北工場 御中

試験番号 24S15336-1/4頁

発行日 令和6年11月26日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8339

承認署名者・所長 木村 敏彦



件 名		
顧 客 名 称		田中コンクリート工業株式会社 東北工場
顧 客 住 所		秋田県大館市二井田字菖蒲沼28
試 験 品 目	種 類 ※	砂
	産 地 ※	山本郡八峰町峰浜沼田字ホナン沼端4-6
	採取場所※	田中コンクリート工業株式会社 東北工場 スtockヤード
	採 取 者 ※	土濃塚 康隆
	採取月日※	令和 6 年1 1月1 3日
	そ の 他 ※	
	受入れ時の状態	持込み・土嚢袋1袋（約25 kg）
受領年月日		令和 6 年1 1月1 3日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験項目及び試験方法	試 験 結 果
有機不純物 JIS A 1105:2015	試験年月日：令和6年11月20日 試験実施場所：技術研修センター 計量室 標準色より淡い ✓
塩 化 物 量 JIS A 5308:2024 附属書JA JA.10p)	0.001 % ☆詳細は3頁のとおり ✓
安 定 性 JIS A 1122:2014	1.5 % ☆詳細は4頁のとおり ✓
備 考	
・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。	

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみに有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

原本と相違ない事を証明します
田中コンクリート工業株式会社
東北工場



工場長	QCM	係



110322JP

株式会社青森グローバル産業 御中

骨材のアルカリシリカ反応性試験結果報告書

試験番号 25C5889-1/1頁

発行日 令和7年5月15日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8339

承認署名者・所長 木村敏彦

件名		
顧客名称		株式会社青森グローバル産業
顧客住所		青森県西津軽郡深浦町大字大間越字寛46番地4
試験品目	種類※	混合砂
	産地※	山本郡八峰町峰浜沼田地内
	採取場所※	山本郡八峰町峰浜沼田字ホナン沼端4-6
	採取者※	小林 正信
	採取月日※	令和 7 年 5 月 1 日
	製造業者※	株式会社青森グローバル産業
	その他※ (採取立会者)	
	受入れ時の状態	持込み・土嚢袋 2 袋(約50 kg)
	受領年月日	令和 7 年 5 月 1 日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験年月日	令和7年5月13日～5月14日				
試験実施場所	技術研修センター計量室				
試験方法	JIS A 1145:2022「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」 但し、溶解シリカ量の定量は原子吸光光度法により行った。				
試験項目	試験結果 (mmol/L)				判定
	1	2	3	平均値	
アルカリ濃度減少量 (Rc)	55	55	56	55	無害✓
溶解シリカ量 (Sc)	38	38	38	38	

判定は、JIS A 1145:2022 11 骨材のアルカリシリカ反応性の判定によった。

この判定には、試験における測定の不確かさを考慮していません。原本と相違ない事を証明します

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。

田中コンクリート工業(株)

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、
完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

以上



工場長	QCM	係

原本と相違ないことを証明します。

令和7年5月15日

秋田市寺内蛭根1-15-18


秋田県生コンクリート工業組合
技術研修センター

調定番号 25-0446
令和 7 年 9 月 19 日

秋田県大館市花岡町字大森山下 67 番地
白川建設株式会社 様

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄 4 番地の 11
一般財団法人秋田県建設・工業技術セン
工業材料試験センター

理事長 川 辺 透



試 験 報 告 書

調定番号 25-0446 でご依頼のありました試験の結果を次のとおり報告します。
なお、1. 試料の名称、2. 産地又は製造者名、4. 工事名等は、依頼者の資料によります。

1. 試料	名 称 : 碎石 2005
	搬 入 日 : 令和 7 年 9 月 4 日
	サンプリング : 依頼者が持ち込んだ状態のままで試験実施
2. 産地又は製造者名	大館市粕田産
3. 試験依頼日	令和 7 年 9 月 4 日
4. 工事名等	—
5. 試験項目	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)

6. 試験場所	一般財団法人 秋田県建設・工業技術センター 工業材料試験センター
7. 試験結果	別紙のとおり
8. 報告書発行責任者	品質管理者 佐藤 愁子

備考

本報告書の試験結果は、依頼された試料についてのみ有効です。原本と相違ない事を証明します
以下余白


田中コンクリート工業(株)

東北工場

調定番号 25-0446	骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)	2/2
依頼者	白川建設株式会社	
試料名	碎石2005	
試験日	令和7年9月17日	室温 25 °C
試験者	佐藤 愁子	
試験方法	JIS A 1145	

試験項目	試験結果 (mmol/L)				判定
	1	2	3	平均値	
アルカリ濃度減少量 (Rc)	180	182	182	181	無害 ✓
溶解シリカ量 (Sc)	19	19	19	19	

判定は、「a)溶解シリカ量(Sc)が10mmol/L以上で、アルカリ濃度減少量(Rc)が700mmol/L未満の範囲では、溶解シリカ量(Sc)がアルカリ濃度減少量(Rc)未満となる場合、その骨材を”無害”と判定し、溶解シリカ量(Sc)がアルカリ濃度減少量(Rc)以上となる場合、その骨材を”無害でない”と判定する。」による。

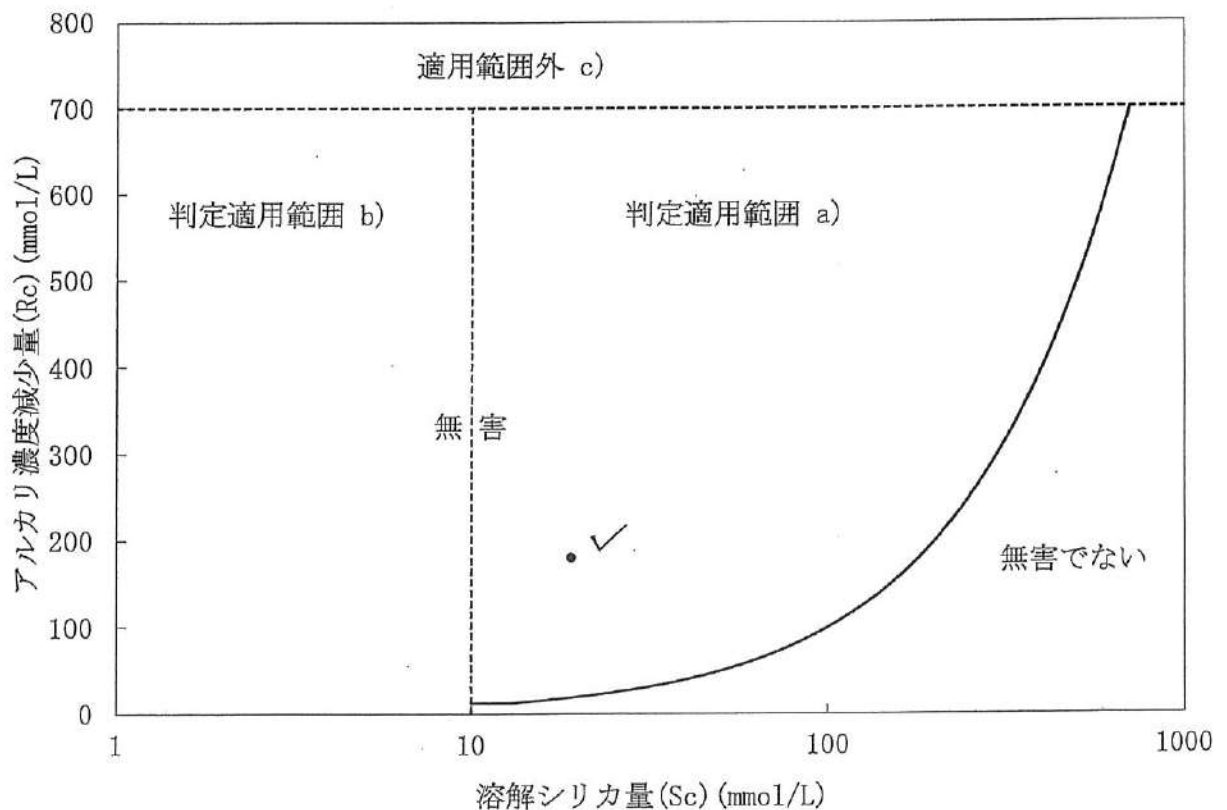

備考
なし

原本と相違ない事を証明します
田中コンクリート工業(株)
東北工場



工場長	QCM	係

工場長	QCM	係
		

試験分析報告書

日鉄環境エネルギーソリューション株式会社

様

発行日：2025年7月24日

報告書番号：25-1010-1-2

件名 スラグの分析・測定業務

試料名 溶融スラグ 化学成分

受付日 2025年7月8日

受付方法 宅配便

採取日 2025年7月7日

採取者 日鉄環境エネルギーソリューション株式会社

採取場所 秋田市総合環境センター

日鉄環境株式会社

分析ソリューション事業本部

東日本センター 釜石環境分析室

〒026-8567 岩手県釜石市錦戸

TEL 0193-22-2141 FAX 0193-22-5989


ご依頼の試料について分析した結果を、次の通り報告します。

No	分析の対象	分析の結果	規格値		単位	分析の方法
			コンクリート骨材	道路用材		
1	酸化カルシウム (CaO として)	34.1 ✓	45.0以下	-	%	JIS A 5011-3 附属書A
2	全硫黄 (S として)	0.29 ✓	2.0以下	-	%	JIS A 5011-3 附属書A
3	三酸化硫黄 (SO ₃ として)	0.1未満 ✓	0.5以下	-	%	JIS A 5011-3 附属書A
4	金属鉄 (Fe として)	0.23 ✓	1.0以下	1.0以下	%	JIS A 5011-2 附属書A
5	塩化物 (NaCl として)	0.001未満 ✓	0.04以下	-	%	JIS A 5011-3 附属書A
6	- 以下余白 -					
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
備考	※規格値は「令和5年4月付秋田県溶融スラグ使用基準」に基づく					

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場



試験分析報告書

日鉄環境エネルギーソリューション株式会社

様

発行日：2025年7月24日

報告書番号：25-1010-2-2

件名 スラッグの分析・測定業務

試料名 熔融スラッグ 外観・粒度・物理的性質

受付日 2025年7月8日

受付方法 宅配便

採取日 2025年7月7日

採取者 日鉄環境エネルギーソリューション株式会社

採取場所 秋田市総合環境センター

日鉄環境株式会社

分析ソリューション事業本部

東日本センター 釜石環境分析

〒026-8567 岩手県釜石市錦

TEL 0193-22-2141 FAX 0193-22-5989

ご依頼の試料について分析した結果を、次の通り報告します。

No	分析の対象		分析の結果	規格値		単位	分析の方法
				コンクリート骨材	道路用材		
1	絶乾密度	✓	2.83 ✓	2.5以上	-	g/cm ³	JIS A 1109
2	表乾密度	✓	2.84	-	2.45以上	g/cm ³	JIS A 1109
3	吸水率		0.28 ✓	3.0以下	-	%	JIS A 1109
4	粒形判定実績率	✓	55.8 ✓	53以上	-	%	JIS A 5005
5	微粒分量	✓	3.2 ✓	7.0以下	-	%	JIS A 1103
6	安定性		1.6 ✓	10以下	-	%	JIS A 1122
7	有機不純物	✓	淡い ✓	-	-	-	JIS A 1105
8	アルカリシカ反応性	✓	無害 ✓	-	-	-	JIS A 1145
9	粗粒率		2.57	-	-	%	JIS A 1102
10	ふるい分け試験 通過質量百分率	10 mm	100 ✓	100	-	%	JIS A 1102
11		5.0 mm	100 ✓	90~100	100	%	
12		2.5 mm	99 ✓	80~100	85~100	%	
13		1.2 mm	83 ✓	50~90	-	%	
14		0.6 mm	39 ✓	25~65	-	%	
15		0.3 mm	15 ✓	10~35	-	%	
16		0.15 mm	7 ✓	2~15	-	%	
17		0.075mm	3 ✓	-	0~10	%	
18		0.075mm以下	0	-	-	%	
19	- 以下余白 -						
20							
備考	※規格値は「令和5年4月付秋田県熔融スラッグ使用基準」に基づく						

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場



発行日 令和 7年 7月 24日
No.KLB-250741 記録表 1/6頁

JIS A 1109		細骨材の密度及び吸水率試験方法			
件名	スラグ分析・測定業務	骨材の種類・産地	—		
試料名	熔融スラグ (7月)	最大寸法 (mm)・外観	—		
採取場所	秋田市総合環境センター	試験日	2025年7月15日		
採取日	2025年7月	試験者	小峯 佳隆		
試験室の状態	室温	湿度	—		—
	26 °C	76 %			
試験結果					
試験番号			1	2	合否
m1	(ビクメーター+水) の質量	g	1197.5	1176.8	—
m2	密度試験用試料の表乾質量	g	500.0	500.0	—
—	試験に使用した水の温度	°C	22.0	22.0	—
ρ_w	試験に使用した水の密度	g/cm ³	0.9978	0.9978	—
m3	(ビクメーター+水+試料) の質量	g	1521.4	1501.6	—
d_s	表乾密度	g/cm ³	2.83	2.85	—
	$\frac{m2}{m1 + m2 - m3} \times \rho_w$		平均		
			2.84		
—	表乾密度の平均値からの差	g/cm ³	0.01 ✓	0.01	—
m4	吸水率測定用試料の表乾質量	g	500.0	500.0	—
m5	吸水率測定用試料の絶乾質量	g	498.6	498.6	—
Q	吸水率	%	0.28	0.28	—
	$\frac{m4 - m5}{m5} \times 100$		平均		
			0.28		
—	吸水率の平均値からの差	%	0.00	0.00	—
d_0	絶乾密度	g/cm ³	2.82	2.84	—
	$d_s \times \frac{m5}{m4}$		平均		
			2.83 ✓		
—	絶乾密度の平均値からの差	g/cm ³	0.01 ✓	0.01 ✓	—
【備考】					
平均値からの差が、密度の場合は0.01g/cm ³ 以下、吸水率の場合は0.05%以下でなければならない。					

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場



JIS A 1122		硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法											
件名	スラグ分析・測定業務		骨材の種類・産地		—								
試料名	溶融スラグ (7月)		最大寸法(mm)・外観		—								
採取場所	秋田市総合環境センター		試験日		2025年7月14日								
採取日	2025年7月		試験者		小峯 佳隆								
試験室の状態	室温		湿度		—		—						
	— °C		— %										
試験結果													
骨材の種類	通るふるい mm	とどまるふるい mm	①各群の 質量分率 %	②試験前 の各群の 質量 g	③試験後 の各群の 質量 g	④各群の損失質量分率 %	⑤骨材の損失質量分率 %						
細骨材	0.15	—	6.7	—	—	— *1	—						
	0.3	0.15	8.0	—	—	— *1	—						
	0.6	0.3	24.2	100.0	98.9	1.1	0.3						
	1.2	0.6	44.5	100.0	98.0	2.0	0.9						
	2.5	1.2	15.8	100.0	97.2	2.8	0.4						
	5	2.5	0.8	—	—	2.8 *2	0.0						
	10	5	0.0	—	—	—	—						
	合計		100.0	—	—	—	1.6 ✓						
粗骨材	10	5											
	15	10											
	20	15											
	25	20											
	40	25											
	60	40											
	80	60											
	合計												
【備考】													
*1 : 0.3mmふるいを通過する粒子の損失質量は 0 とした。													
*2 : 実際に試験を行った最も近い群の損失質量分率を採用した。													
原本と相違ない事を証明します 田中コンクリート工業(株) 東北工場													
				<table border="1"> <tr> <td>工場長</td> <td>QCM</td> <td>係</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				工場長	QCM	係			
工場長	QCM	係											
													

発行日 令和7年7月24日
No.KLB-250741 記録表 3/6頁

JIS A 5005		コンクリート用碎石及び砕砂（粒形判定実積率試験）									
件名	スラグ分析・測定業務		骨材の種類・産地		—						
試料名	溶融スラグ（7月）		最大寸法（mm）・外観		—						
採取場所	秋田市総合環境センター		試験日		2025年7月23日						
採取日	2025年7月		試験者		小峯 佳隆						
d_b 骨材の絶乾密度	2.83 g/cm^3		—		—						
試験室の状態	室温	湿度		—	—						
	26 °C	63 %									
条件	試料の状態	試料の詰め方		含水率測定 ^{*1}	—						
	絶乾状態	棒突き		無							
試験結果											
試験番号		1	2	1	2						
V	容器の容積	L	2.00	2.00							
①	容器の質量	kg	1.48	1.48							
②	（試料+容器）の質量	kg	4.63	4.64							
m_1	試料質量 $m_1 = ② - ①$	kg	3.15	3.16							
m_2	含水率測定に用いた試料の乾燥前の質量	g	—	—							
m_b	含水率測定に用いた試料の乾燥後の質量	g	—	—							
T	単位容積質量 $T = \frac{m_1}{V}$ 又は $T = \frac{m_1}{V} \times \frac{m_b}{m_2}$	kg/L	1.58	1.58							
	平均値	kg/L	1.58								
—	平均値からの差 ^{*2}	kg/L	0.00	0.00							
G	粒形判定実積率 $G = \frac{T}{d_b} \times 100$	%	55.8	55.8							
	平均値	%	55.8								
—	平均値からの差	%	0.0	0.0							
判定		—	—								
【備考】 *1：絶乾状態の試料を用いる場合又は試料の含水率が1.0%以下の見込みの場合は、含水率の測定は省略してよい。 *2：試験は2回行い、その精度は、平均値からの差が0.01kg/L以下でなければならない。											
原本と相違ない事を証明します 田中コンクリート工業(株) 東北工場		 <table border="1"> <tr> <td>工場長</td> <td>QCM</td> <td>係</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				工場長	QCM	係			
工場長	QCM	係									
											


発行日 令和 7年 7月 24日
No.KLB-250741 記録表 4/6頁

JIS A 1103		骨材の微粒分量試験方法			
件名	スラグ分析・測定業務		骨材の種類・産地	—	
試料名	溶融スラグ (7月)		最大寸法 (mm)・外観	—	
採取場所	秋田市総合環境センター		試験日	2025年7月16日	
採取日	2025年7月		試験者	小峯 佳隆	
試験室の状態	室温	湿度	—	—	
	— °C	— %			
試験結果					
試験番号		1	2	1	2
m1	洗う前の試料の乾燥質量	g	570.0	602.6	
m2	洗った後の試料の乾燥質量	g	551.6	583.5	
A	微粒分量 $A = \frac{m1 - m2}{m1} \times 100$	%	3.2	3.2	
	平均値	%	3.2		
—	平均値からの差 *1	%	0.0 ✓	0.0 ✓	
【備考】					
*1: 試験は2回行い、その精度は平均値からの偏差が細骨材の場合、0.3%以下、粗骨材の場合、0.2%以下でなければならない。					
原本と相違ない事を証明します 田中コンクリート工業(株) 東北工場					



JIS A 1145		骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）									
件名		スラグ分析・測定業務				骨材の種類・産地		—			
試料名		溶融スラグ（7月）				最大寸法（mm）・外観		—			
採取場所		秋田市総合環境センター				試験日		2025年7月18日			
採取日		2025年7月				試験者		恩田 学洋			
試験室の状態		室温		湿度		—		—		—	
		—℃		—%							
試験結果											
試験番号	試料量 g	反応時間 h	アルカリ濃度減少量					溶解シリカ量			判定結果
			V ₁ mL	V ₂ mL	V ₃ mL	Rc mmol/L	平均 mmol/L	W g	Sc mmol/L	平均 mmol/L	
1	25	24	20	18.70	19.10	20	25	0.0005	2	2	無害 ✓ 無害でない
2	25	24	20	18.50	19.10	30		0.0006	2		
3	25	24	20	18.60	19.10	25		0.0004	1		
アルカリ濃度減少量の定量方法			滴定法 $Rc = \frac{20 \times 0.05 \times F}{V_1} \times (V_3 - V_2) \times 1000$				溶解シリカ量の定量方法		質量法 $Sc = 3330 \times W$		
V ₁ : 希釈試料溶液からの分取量 V ₂ : 希釈試料溶液の滴定に要した0.05N-HCl V ₃ : 希釈空試験溶液の滴定に要した0.05N-HCl						Rc : アルカリ濃度減少量 W : 試料原液5ml中のシリカの質量 Sc : 溶解シリカ量					
1N-NaOHのファクター : 1.000 0.05N-HClのファクター(F) : 0.999											
判定基準 溶解シリカ量(Sc)が10mmol/L以上で、アルカリ濃度減少量(Rc)が700mmol/L未満のとき、 溶解シリカ量(Sc)が、アルカリ濃度減少量(Rc)以上になる場合、 この骨材は無害でないものと判定し、それ以外の場合を無害と判定する。											
【備考】											
原本と相違ない事を証明します 田中コンクリート工業(株) 東北工場											

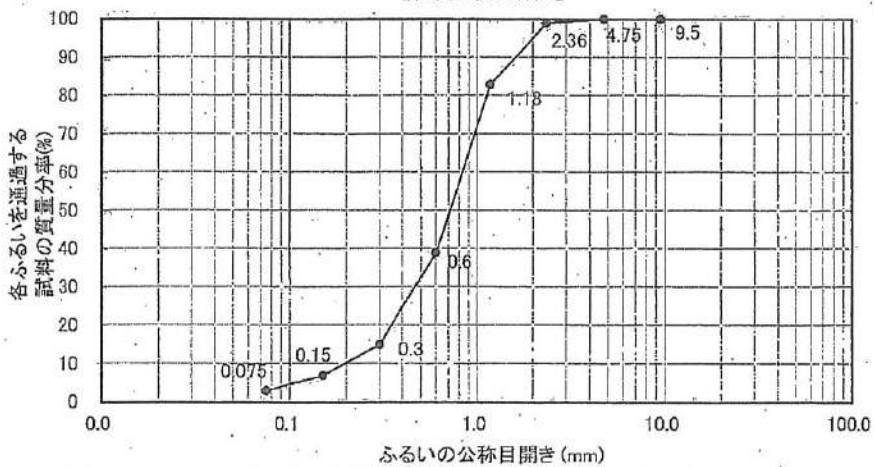

JIS A 1102		骨材のふるい分け試験方法		
件名	スラグ分析・測定業務	骨材の種類・産地	—	
試料名	溶融スラグ (7月)	最大寸法 (mm)・外観	—	
採取場所	秋田市総合環境センター	試験日	2025年7月11日	
採取日	2025年7月	試験者	小峯 佳隆	
試験室の状態	室温	湿度	—	
	24 °C	70 %		
ふるい分け前の試料の質量	1055.9 g	ふるい分け方法	機械	
試験結果				
ふるいの公称目開き	連続する各ふるいの間にとどまる試料の質量 g	連続する各ふるいの間にとどまる試料の質量分率 %	各ふるいにとどまる試料の質量分率 %	各ふるいを通過する試料の質量分率 %
9.5mm (10mm)	0.0	0	0	100
4.75mm (5mm)	0.0	0	0	100
2.36mm (2.5mm)	8.3	1	1	99
1.18mm (1.2mm)	166.8	16	17	83
600 μ m (0.6mm)	469.0	44 *1	61	39
300 μ m (0.3mm)	254.4	24	85	15
150 μ m (0.15mm)	84.4	8	93	7
75 μ m (0.075mm)	39.1	4	97	3
75 μ m (0.075mm) 以下 以下余白	31.2	3	100	0
合計	1053.2	100	—	—
粗粒率	—	—	2.57 /	—
【粒度加積曲線図】				
				
【備考】				
*1: 連続する各ふるいの間にとどまる試料の質量分率の総和 (%) が100%とならなかった為、JIS A 1102に従って最も大きい質量分率を加減して、調整した値です。				

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場



1. 熔融スラグ骨材を用いたモルタルの膨張率試験

(1)試験方法 JIS A 5031:2016 附属書A「熔融スラグ骨材を用いたモルタルの膨張率試験方法」による。

(2)試験結果

試験No.	4時間後の膨張率(%)	24時間後の膨張率(%)
1	0	-1
2	0	-1
3	0	-1
平均	0	-1 ✓

2. 熔融スラグ骨材のモルタルによるポップアウト確認試験

(1)試験方法 JIS A 5031:2016 附属書C「熔融スラグ骨材のモルタルによるポップアウト確認試験方法」の煮沸法による。

(2)試験結果

試験No.	凹部の種類毎の個数 (個)		
	核ーあり (ポップアウト)	核ーなし (ポップアウトでない)	判定が困難 (ポップアウトでない)
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
合計	0	0	0 ✓

以上



工場長	QCM	係

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場

水 質 試 験 結 果 報 告 書

田中コンクリート工業株式会社 東北工場 御中

試験番号 24水4970-1/3頁
発行日 令和6年12月13日
〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18
秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター
TEL018-824-5540, FAX018-823-8339
承認署名者・所長 木村 敏彦

件名		
顧客		田中コンクリート工業株式会社 東北工場
顧客住所		大館市二井田字菖蒲沼28
試験品目	種類 ※	上水道水以外の水（地下水）
	採取場所 ※	田中コンクリート工業株式会社 東北工場
	採取者 ※	土濃塚 康隆
	採取月日 ※	令和 6 年11月13日
	受入時の状態	持込み・ペットボトル4 L
	受領年月日	令和 6 年11月13日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験方法	JIS A 5308 : 2024 附属書JC		
試験項目	試	験	結 果
懸濁物質の量	試験年月日	令和 6 年 1 1 月 1 4 日	
	試験実施場所	技術研修センター 計量室 0.0 g/L ✓	
溶解性蒸発残留物の量	試験年月日	令和 6 年 1 1 月 1 4 日	
	試験実施場所	技術研修センター 計量室 0.3 g/L ✓	
塩化物イオン (C l ⁻) 量			13.06 mg/L ✓
	☆詳細は 2 頁のとおり		
セメントの凝結時間の差	始発時間の差		0 分
	終結時間の差		5 分 ✓
	☆詳細は 3 頁のとおり		
モルタルの圧縮強さの比	材 齢 7 日		101 %
	材 齢 2 8 日		99 % ✓
	☆詳細は 3 頁のとおり		
備考 基準水は精製水を使用した。			
・ 上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。			

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試験品目についてのみ有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部分だけを複製しないで下さい。

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)



24水4970-3/3頁

セメントの凝結時間の差の試験及びモルタルの圧縮強さの比の試験表			
試 料	No.	基 準 水	水-4970
	工 場 名	_____	田中コンクリート工業㈱ 東北工場
	種 類	精 製 水	上水道水以外の水（地下水）
試 験 方 法		セメントの凝結時間の差の試験 (JIS A 5308 : 2024 附属書JC)	
試 験 実 施 場 所		技術研修センター 恒温室	
試 験 年 月 日		令和 6 年 11 月 15 日	
試 験 値	始発時間	140 分	140 分
	終結時間	200 分	205 分
	始発時間の差	_____	0 分
	終結時間の差	_____	5 分 ✓
試 験 方 法		モルタルの圧縮強さの比の試験（B法） (JIS A 5308 : 2024 附属書JC)	
試 験 実 施 場 所		技術研修センター 恒温室・試験室	
供 試 体 製 作 月 日		令和 6 年 11 月 14 日	
材 齢 7 日 圧 縮 強 さ 試 験 日		令和 6 年 11 月 21 日	
材 齢 7 日 圧 縮 強 さ (N/mm ²)		42.3	42.6
材 齢 7 日 圧 縮 強 さ の 比		_____	101 % ✓
材 齢 28 日 圧 縮 強 さ 試 験 日		令和 6 年 12 月 12 日	
材 齢 28 日 圧 縮 強 さ (N/mm ²)		55.7	55.4
材 齢 28 日 圧 縮 強 さ の 比		_____	99 % ✓
備考			

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター
以上

原本と相違ない事を証明します
 田中コンクリート工業㈱
 東北工場



工場長	QCM	係

24水4970-2/3頁

塩化物イオン (Cl ⁻) 量の試験表			
試験方法		塩化物イオン(Cl ⁻)量の試験(JIS A 5308:2024 附属書JC) (フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の 試験方法(電位差滴定法) (JIS A 1144:2010))	
試験年月日		令和6年11月14日	
試験実施場所		技術研修センター 計量室	
試料	No.	水-4970	
	工場名	田中コンクリート工業株式会社 東北工場	
	種類	上水道水以外の水(地下水)	
測定番号		1	2
試料の量: V (mL)		100	100
試験滴定量: a (0.0282 mol/L-AgNO ₃) (mL)		1.3033	1.3059
0.0282 mol/L-AgNO ₃ のファクター: f		1.001	1.001
塩化物イオン (Cl ⁻) 量: C (mg/L)		13.046	13.072
平均値 (mg/L)		13.06 ✓	
備考 機種名: 電位差自動滴定装置AT-710 (京都電子工業株式会社)			

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

原本と相違ない事を証明します
田中コンクリート工業(株)
東北工場



2025年7月 ～ 2025年12月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

田中コンクリート工業(株)
東北工場

御中

種類 AE減水剤 標準形 I種

商品名 ヤマソー90SE



1. コンクリートの試験結果

項 目		JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値	
フレッシュ コンクリート	減 水 率 %	10以上	15 ✓	15	
	ブリーディング量の比 %	70以下	59 ✓	—	
	ブリーディング量の差 cm3/cm2	—	—	—	
	凝結時間の差 分	始 発	+ 70 ✓	+ 50	
		終 結	+ 60 ✓	+ 45	
	経時変化量	スランプ cm	—	—	—
空気量 %		—	—	—	
硬化 コンクリート	圧縮強度比 %	材齢 1日	—	—	
		材齢 2日 (5℃)	—	—	
		材齢 7日	110以上	129 ✓	128
		材齢28日	110以上	118 ✓	115
	長さ変化比 %	120以下	98 ✓	—	
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)		60以上	97 ✓	—

注記1. 1m³当たりの化学混和剤の使用量形式評価試験 1.77 kg/m³, 性能確認試験 1.77 kg/m³注記2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年 5月
の試験結果である。ただし、圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している
試験値は、2024年 12月 の試験結果である。注記3. この表に表示している形式評価試験は、2021年 5月 に 山宗化学株式会社
で実施した試験結果である。2. 塩化物イオン(Cl⁻)量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204に よる規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の 含有量	1m ³ 当たりの化学 混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン(Cl ⁻)量	0.02 kg/m ³ 以下	0.00 kg/m ³	0.01 %	1.77 kg/m ³	0.00 kg/m ³ ✓
全アルカリ量	0.30 kg/m ³ 以下	0.06 kg/m ³	3.7 %	1.77 kg/m ³	0.07 kg/m ³ ✓

注記1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年 5月 の試験結果である。

注記2. この表に表示している形式評価試験は、2021年 5月 に 山宗化学株式会社
で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項 目	規 格 値	試 験 値
密度 (g/cm ³ , 20℃)	1.16 ～ 1.20	1.18 ✓

注記 この表に表示している試験値は、2025年 5月 の試験結果である。

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)



コンクリート用鉄線 (SWM-P) 検査証明書

証明書番号 202508-P005

2025 年 8 月 1 日 発行

JIS G 3532 ✓

納入先 田中コンクリート工業株式会社 御中

青森昭和産業株式会社 青森県弘前市大字一町 青森昭和産業株式会社

〒036-1325 青森県弘前市大字一町 青森昭和産業株式会社

TEL (0172) 82-4611 (代) FAX (0172) 82-4611



古山

線径 (mm)	測定値 (mm)	最大引張荷重 (N)	引張強さ (N/mm ²)	絞り (%)	曲げ性 ★	外観	判定
2.60	2.59✓	4330	822✓	57✓	G	G	GOOD✓
2.60	2.58✓	4060	777✓	57✓	G	G	GOOD✓
3.20	3.18✓	6235	785✓	56✓	G	G	GOOD✓
3.20	3.17✓	5790	734✓	56✓	G	G	GOOD✓
4.00	3.98✓	8055	647✓	64✓	G	G	GOOD✓
4.00	3.97✓	7650	618✓	67✓	G	G	GOOD✓
5.00	4.98✓	12760	655✓	61✓	G	G	GOOD✓
5.00	4.97✓	12150	626✓	59✓	G	G	GOOD✓
6.00	5.98✓	17230	613✓	60✓	G	G	GOOD✓
6.00	5.97✓	16340	584✓	60✓	G	G	GOOD✓

JIS G 3532 コンクリート用鉄線 (SWM-P)				★曲げ角度 160° ~180° 内側半径は線径の 3D/2 以下 上記注文品は、検査の結果指定 の規格に合格していることを証 明致します。
線径 (mm)	許容差 (mm)	引張強さ (N/mm ²)	絞り (%)	
2.60・2.90	±0.06	540以上	30以上	
3.00・3.20	±0.08			
3.50・4.00	±0.08			
4.50	±0.10			
5.00・5.50・6.00	±0.10			
7.00	±0.13			

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業株式会社



工場長	QCM	係

文者店部課工、
文者照合番号
注契商規需
文約品要
者号名格家号

-018933

UNITED STATES
5-210-E2-1-4-B452-01
BAR IN COIL ✓
IS G 3112 SD295 RN
OMORI SHOWA SANGYO

BAR IN COIL ✓

IS G 3112 SD295 RN
MORI SIOWA SANGYO

鋼材檢査証明書



日本製鉄株式会社
NIPPON STEEL CORPORATION

本社 社：〒100-8071 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
北日本製鉄所釜石地区：〒026-8567 岩手県釜石市釜子町23番15号



Steelinc
NEW STEEL AGE

証明書番号 2505C0187 2025年05月21日発行年月日

頁 13

寸 法 mm	負 数	質 量 kg	製鋼番号	管理番号	引 張 試 験 (G. L = DX8)		BT	化 学 成 分 %							
					引張力 (N/mm ²)	伸 び % 校 正		C X100	Si X100	Mn X100	P X1000	S X1000			
D6 ✓	16	15952	M68502		326	543	31	✓	22	21	✓	75	21	✓	14
	2	1998	M68504		325	536	31	✓	22	20	✓	75	22	✓	14
TOTAL		17950													

青森昭和田産業株式会社

青森県弘前市大湊

TEL (0172) 82-4611

FAX (0172) 82-4613

：老

MELTED, POURED AND PROCESSED IN JAPAN

品名	...
----	-----

G.L.: 標点距離
NMI: 漢字距離

BT: 曲げ試験、AGS: オーステナイト結晶粒度、DEC: 脱炭層深さ試験、P: 製品分析

上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

北日本製鉄所
品質保証室長
平林 圭



く注意とお願ひ>>本証明書の改変や不正使用は、固く禁じられております。本証明書の真偽については、次の当社窓口までお問い合わせ下さい (E-mail, bai-wire-rod@jp.nipponsteel.com)。

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリー

送無子

晴



工場長	QCM
-----	-----

	
---	---

12

係

9

検査証明書

証明番号 : 359-902218
契約 No. : 04-004-20018
出荷依頼 No. : 09520
出荷案内 No. : 061102
契約先 : 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 東北支社 棒鋼課
特約店 : 青森昭和産業 (株)
荷工受事人 :

品名 : パーインコイル
規格 : JIS G3112 SD295

発行日 2025年 5月27日
Page: 1/1

認証番号 QAO307023

北越メタル株式会社
本社: 新潟県新潟市東区 五反田 1-1-1
三 条 工 場 〒955-0852 新潟県三条市南四郎 1-1-1

項目	溶鋼番号	数量	質量 (kg)	化学成分 (%)										引張試験				曲げ試験	備考		
				C	Si	Mn	P	S	Cu	Or	Sn	Ni	Mo	V	B	C _{eq} N/100	断面収縮率 N/mm ²			(1) 伸び %	断面比 %
寸法				27	55	150	50	50				× 100			× 100		295	600		16	
	D6✓	51090	4	2,138	17	13	47	24	26								2	363	523	32	69
	D6✓	51091	12	6,414	18	14	48	27	25								2	362	528	30	69
	D6✓	51107	2	1,069	18	12	49	22	24								2	356	522	30	68
	D6✓	51186	22	11,759	18	13	47	25	24								2	362	519	30	70
* サイズ		40	21,380																		
* 総合計		40	21,380																		

青森昭和産業株式会社
青森県弘前市大和町 1-1-1
TEL: 0172-244611
FAX: 0172-244611

注(1) JIS G3112の形状・寸法・公差・引張試験の項目については、呼び名を添付することにより14A号鋼の引張試験の規格に適合することを証明します。ただし、引張試験は4とする。

原本と相違ない事を証明します
田中コンクリート工業㈱ 東北工場

工場長 QCM 係

品質管理責任者
田中 康
田中 康

検査証明書

棒鋼

発行日 2025年 3月26日
Page: 1/1

認証番号 0A0307023

北越メタル株式会社
本社・長岡工場 〒940-0028 新潟県長岡市南生玉五反田 号
三条工場 〒955-0852 新潟県三条市南四郎町一丁目2番4号

証明書番号 : 119-932550
契約 No. : 02-184-00018
出荷依頼書 No. : 03441
出荷案内書 No. : 075585
契約先 : 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) 東北支社 棒鋼課
特約店 : 青森昭和産業(株)
特約受事人 :
特約受事工場 :

品名 : U-CON295

規格 : JIS G3112 SD295

項目	溶鋼番号	数量 (本)	質量 (kg)	化学成分 (%)													引張試験		曲げ試験	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Sn	Ni	Mo	V	B	C _{eq}	Mn _{eq}	引張強さ N/mm ²			伸び (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
規格	寸法	値	長さ(m)	27	55	150	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

青森昭和産業株式会社
青森県弘前市大須賀町4番地
TEL (0172) 824 461 (代)
FAX (0172) 824 461 3

注(1) JIS G 3112の形状・寸法・公差・引張強さ・伸び・断面収縮率については、呼び名3を附すことに14A号規格の伸びの規格値からそれぞれ2を減じる。ただし、減じる限度は4とする。

上記で注文品は検査の結果指定の規格に合格したことを証明します。

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)
東北工場

品質管理責任者
部長
P. Yoshida


工場長 QCM 係

合

出荷番号	出荷番号	商社No.
00163878	00147403	6K250809-001
		出荷日付
		2025/06/16

鋼材檢査証明書

規格 JIS G 3112✓



〒300-4111
 茨城県土浦市大畑580番地
 TEL: 029(862)5531
 FAX: 029(862)5115

御中 株式会社産業鐵合：先得意

特約店：
需要家：
工事名：

殷 岩木工場 青森昭和産業(株) 納入先

下記納入品は検査の結果指定の規格に合格していることを証明致します。

[illegible]

1/1

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東江場

工場長	QCM	係
		



製品検査証明書

onicon



株式会社伊藤製作所

本社 東京都千代田区神田小川町一丁目4番地
TEL. 03-5623-7037
筑波工場 茨城県つくば市片山48番地
TEL. 029(637)2111
*石巻工場 宮城県石巻市重吉町2番地
TEL. 0225(96)1111

契約番号 253A5099-12

商社 日鉄物産㈱東北支店

特約店 (株)吉田産業 青森支店

需要家 青森昭和産業(株)

工事名

製品名 鉄筋コンクリート用棒鋼 異形棒鋼

規格 JIS G 3112

種類 SD295

総質量 13,373 kg

100711-12

証明書番号 51224232

発行日 25.04.22

溶鋼番号	呼び名	長さ m	本数	質量 kg	小計 kg	納入明細				機械的性質				化学成分			
						試験 片 (分)	引張力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び %	屈伏比 %	面状試験 角部180度 内側半径	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	%
6626	D13	6.000	1,280	7,642		2	368	518	28	✓	GOOD	21	18	68	29	31	✓
6641	D13	6.000	960	5,731	13,373	2	360	498	28	✓	GOOD	19	17	61	27	22	✓

青森昭和産業株式会社
青森県弘前市大町1-4-1
TEL (0172) 832-2
FAX (0172) 4611 (代)

上記注文品は、ご指定の規格又は仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

原本と相違ない事を証明します
田中コンクリート工業㈱
東北工場

工場長	QCM	係

合

①

This inspection certificate is printed with special forgery-proof technology.
この用紙は特殊偽造防止技術を使用しております。

鋼材検査証明書

規格 JIS G 3112

発行日付 2025/04/17

材料番号	出荷番号	製造所
00169605	00143562	GK250409-001
	出荷日付	
	2025/04/16	

得意先: 合鉄産業株式会社 御中

特約店:

需要家: 青森昭和産業株式会社

工事名: 倉入れ

共英製鋼株式会社

関東事業所 品質管理課

品質管理責任者 渡邊 俊

〒300-4111

茨城県土浦市大畑580番地

TEL: 029(862)5531

FAX: 029(862)5115

TOUGH ON

納入先: 青森昭和産業株式会社 岩木工場 殿

下記納入品は検査の結果指定の規格に合格していることを証明致します。

品名	製造番号	員数	質量(kg)	引張試験				曲げ試験		化 学 成 分 (%)									
				降伏点又は 0.2%耐力 (N/mm ²)	引張強度 (N/mm ²)	降伏比 (%)	伸び率 (%)	曲げ角度 内側半径 180° 1.5D	σ ×100 27以下	Si ×100 55以下	Mn ×100 50以下	P ×100 50以下	S ×1000 50以下	Ni ×100	As ×100	Mo ×1000	V ×1000	Co ×100	
SD295 D13 6.000m	39817	300	1,791	376	492	76	26	GOOD	16	13	63	33	34	11	29	19	4	33	
SD295 D13 6.000m	39818	900	5,373	383	499	77	25	GOOD	18	13	64	30	37	12	30	24	5	36	
	小計	1,200	7,164																
合計		1200	7,164																

青森昭和産業株式会社

青森県弘前市中入道町8-2
TEL 0172-832461(代)
FAX 0172-824613

青森昭和産業株式会社

青森県岩手市大畑580番地

TEL: 029(862)5531

FAX: 029(862)5115


原本と相違ない事を証明し
田中コンクリート工業株式会社
東北工場



工場長	QCM	係

製品検査証明書

onicon



株式会社伊藤製鋼所

本社 東京都千代田区神田小川町一丁目4番地
TEL. 03 (5529) 4530
筑波工場 茨城県つくば市片田4番地
TEL. 029 (837) 2111
*石巻工場 宮城県石巻市重吉町2番地
TEL. 0225 (96) 1111

契約番号 252A5097-1

商社 日鉄物産株式会社

特約店 (株) 吉田産業 青森支店

需要家 青森昭和産業 (株)

工事名

製品名 鉄筋コンクリート用棒鋼 異形棒鋼

規格 JIS G 3112

種類 SD295

総質量 12,500 kg

100706-1

証明書番号 51217550

発行月 25. 03. 11


納入明細			機械的性質				化学成分										
溶鋼番号	呼び名	長さ m	本数	質量 kg	小計 kg	試験 片 (号)	降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び %	降伏比 %	面付試験 角度180度 内側半径	C	Si	Mn	P	S	%
							205 N/mm ²	440 N/mm ²	≥ 16								
0342	✓D16	8.000	1,000	12,500	12,500	2	355 以上	504 600	27 ≥ 16		GOOD 1.5D	19 ≤	17 ≤	64 ≤	28 ≤	21 ≤	

青森昭和産業株式会社
青森県弘前市大森町新田栄村元832-2
TEL (0172) 82-4611 代
FAX (0172) 82-4613

青森昭和産業株式会社
青森県弘前市大森町田代832-2
TEL (0172) 824411 (代)
FAX (0172) 824413

上記注文品はご指定の規格又は仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

原本と相違ない事を証明します
田中コンクリート工業㈱
東北工場



①

This Inspection Certificate is printed with special forgery proof technology.
この用紙は特殊偽造防止技術を使用しております。



- 5. コンクリート試験管理表
 - ①. 圧縮強度管理表
 - ②. スランプ管理表
 - ③. 空気量管理表
 - ④. 生コン中の塩化物測定記録

圧縮強度管理図 (溶融スラグ) (X-R管理図・ヒストグラム)																																		
令和		7		年		8		月		分																	総合判定		工場長		QCM		係	
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
測定	X1	37.5	37.8	41.2	36.3	38.2	38.4	40.8	35.4	37.8	38.2	37.0	40.8	36.1	38.8	36.3	40.8																	
判定	X2	40.8	38.8	35.6	37.0	40.8	37.0	41.5	39.9	40.8	38.5	36.9	41.5	35.3	40.5	35.1	39.2																	
値	X3	36.2	40.9	37.0	35.1	40.7	39.0	40.9	37.3	36.7	35.4	40.8	38.2	37.0	35.9	36.0	35.3																	
	X	38.2	39.2	37.9	36.1	39.9	38.1	41.1	37.5	38.4	37.4	38.2	40.2	36.1	38.4	35.8	38.4																	
	R	4.6	3.1	5.6	1.9	2.6	2.0	0.7	4.5	4.1	3.1	3.9	3.3	1.7	4.6	1.2	5.5																	
	X-X̄	0.0	1.0	-0.3	-2.1	1.7	-0.1	2.9	-0.7	0.2	-0.8	0.0	2.0	-2.1	0.2	-2.4	0.2																	
	(X-X̄)²	0.00	1.00	0.09	4.41	2.89	0.01	8.41	0.49	0.04	0.64	0.00	4.00	4.41	0.04	5.76	0.04																	
判定	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合																	


製品名称	φ10×20併試体
品質特性	圧縮強度試験
養生方法	製品同一養生

設計強度	30.0N/mm²
配合強度	37.5N/mm²
最大値	41.1
最小値	35.8
n	3
D ₄	2.575
d ₃	1.693
A ₂	1.023
ΣX	610.9
ΣR	52.4
Σ(X-X̄)²	32.23
N	16
材料	14日

UCL 41.6
CL 38.2
LCL 34.8

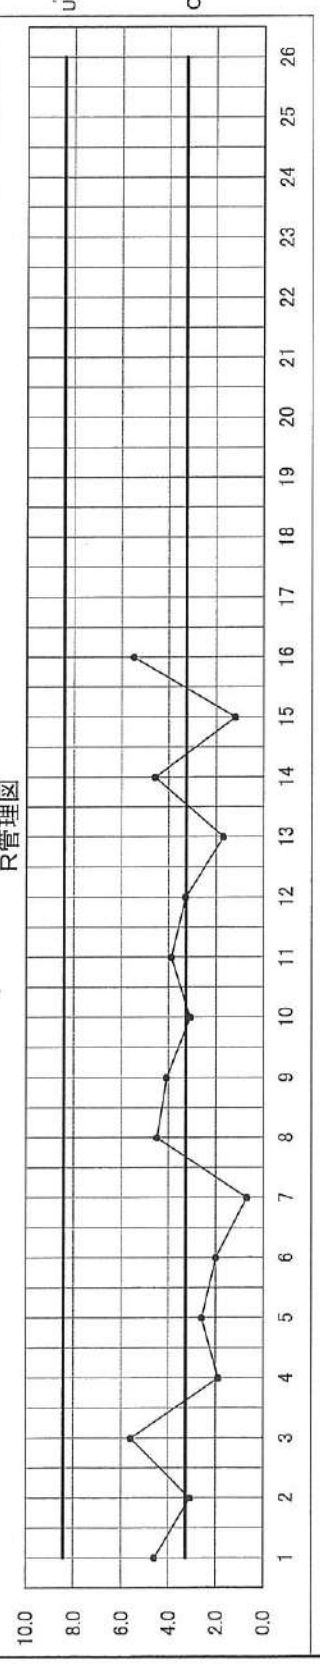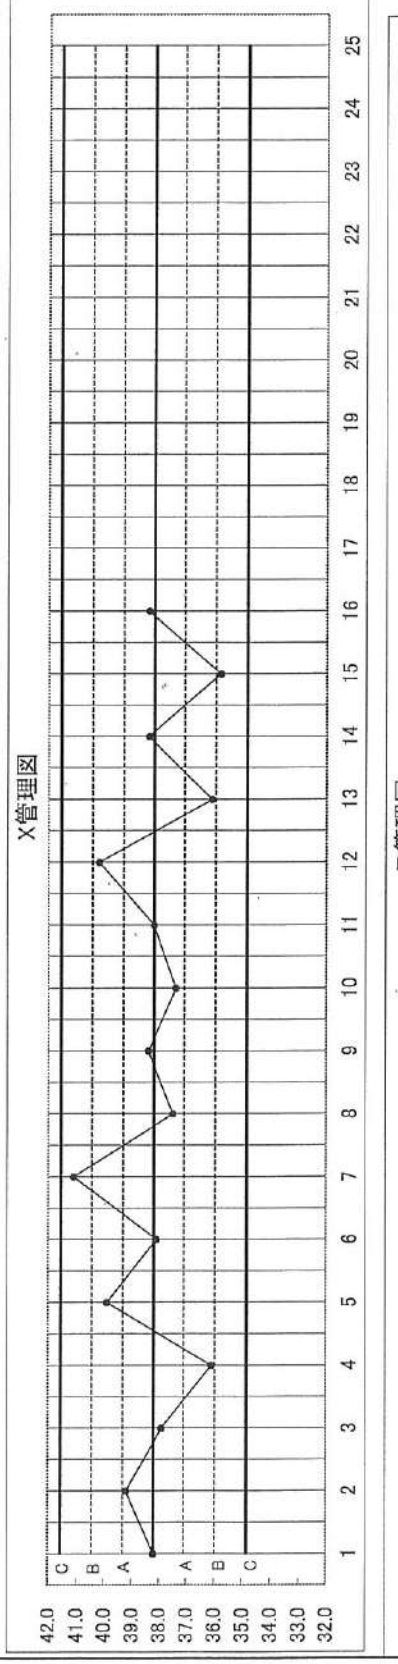

解析	1. 平均強度 (X̄)	=	ΣX/N	=	38.2	6. 全体の標準偏差 (σ)	=	√σW²+σB²	=	2.0
	2. 差の平均 (R̄)	=	ΣR/N	=	3.3	7. 変動係数 (V)	=	σ/X̄*100	=	5.2
	3. Xの標準偏差 (σ _p)	=	√Σ(X-X̄)²/N-1	=	1.5	8. ρ管理限界線 (UCL)	=	X̄+A₂R̄	=	41.6
	4. 日内の標準偏差 (σ _w)	=	R/d₂	=	1.9	ρ管理限界線 (LCL)	=	X̄-A₂R̄	=	34.8
	5. 日間の標準偏差 (Σβ)	=	√σX²-σW²/3	=	0.4	9. R管理限界線 (UCL)	=	D₄R̄	=	8.4

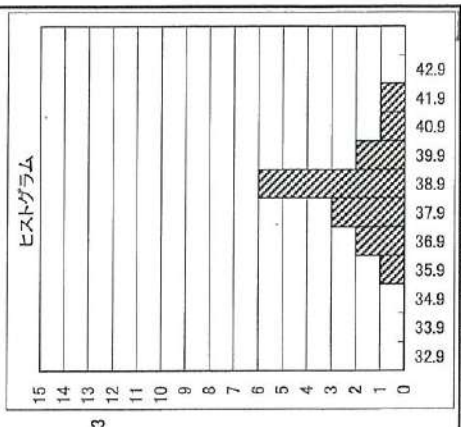

原本と相違ない事を証明します
田中コンクリート工業株式会社
東北工場


空気量管理用紙 (溶融スラグ)

令和 7 年 8 月分


総合判定	工場長	QCM	係

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25														
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25														
日付	1	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
空気量	4.5	4.4	4.6	3.5	5.0	4.4	4.5	3.4	5.0	4.5	4.6	4.4	4.6	4.4	4.6	4.4	5.0	4.0	5.0	4.4	4.6	4.0	5.2	4.3	5.0	4.6	4.7	4.0	3.6	5.0	4.5	3.7							

Gmax20mm 空気量 (単位%)

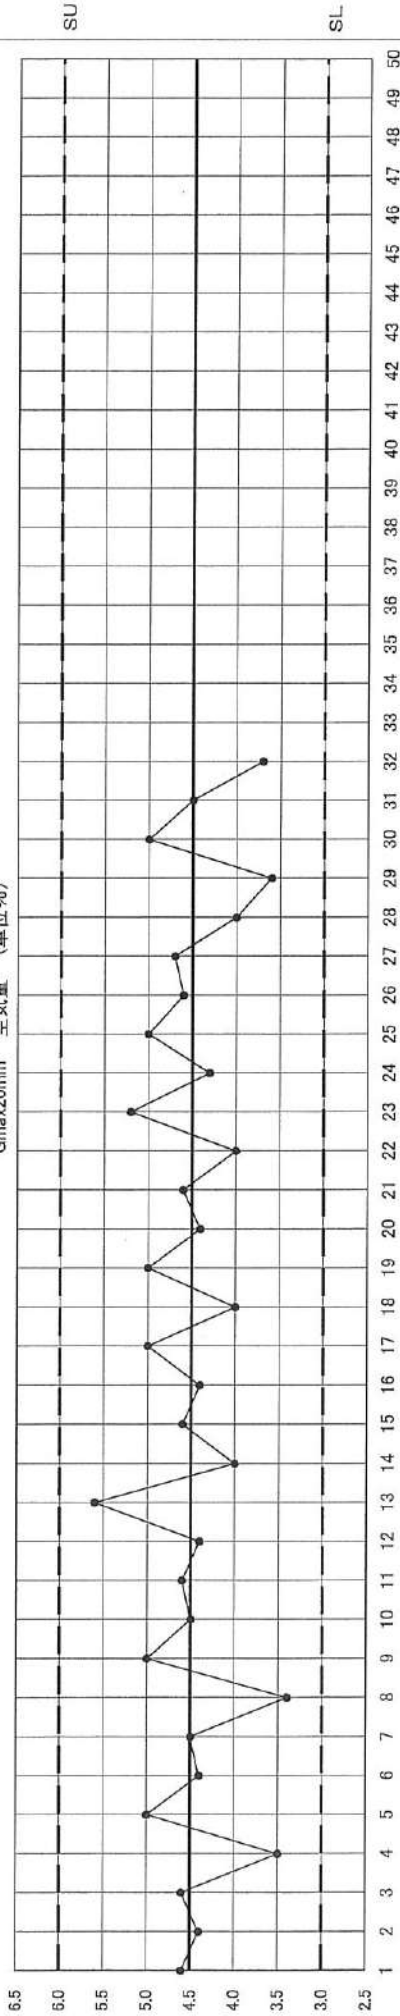

ヒストグラム

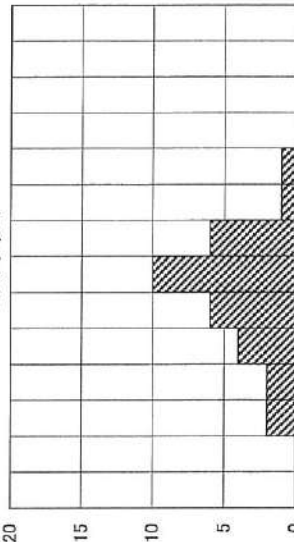

中心値 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0 6.3
h=0.3

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
中心値	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3
f	0	0	2	2	4	6	10	6	1	1	0	0	0
u			-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4		
fu			-8	-6	-8	0	6	2	3	0			
f u ²			32	18	16	6	0	6	4	9	0		

- 平均値(X) $X = \frac{\sum fu}{\sum f} \times h = 4.34$
- 標準偏差(S) $S = h \times \sqrt{1/\sum f - 1 \{ \sum fu^2 - (\sum fu)^2 / \sum f \}} = 0.49$
- 工程能力指数(Cp) $Cp = \frac{SU - SL}{6 \times S} = 1.02$
- 不良の割合
上段規格から外れる割合 $u = \frac{SU - X}{S} = 4.43 (K\epsilon)$
 $PU \approx 0.00 (\%)$
- 不良の割合
下段規格から外れる割合 $u = \frac{X - SL}{S} = 1.72 (K\epsilon)$
 $PL \approx 4.24 (\%)$
- 全体の不良の割合 $P = PU + PL = 4.24 (\%)$

規格値	4.5±1.5%
ロットサイズN	16
サンプルサイズ n	32
最大値	5.6
最小値	3.4
区間の幅h	0.3
O番区間の中心値 X _O	4.5
Σf	32
Σfu	-17
Σfu ²	91


原本と相違ない事を証明します
田中コンクリート工業(株)
東北工場

田中コンクリート工業(株) 東北工場

スランプ管理用紙 (溶融スラグ)


令和 7 年 8 月分

総合判定	工場長	QCM	係
合	米	土塚	長田

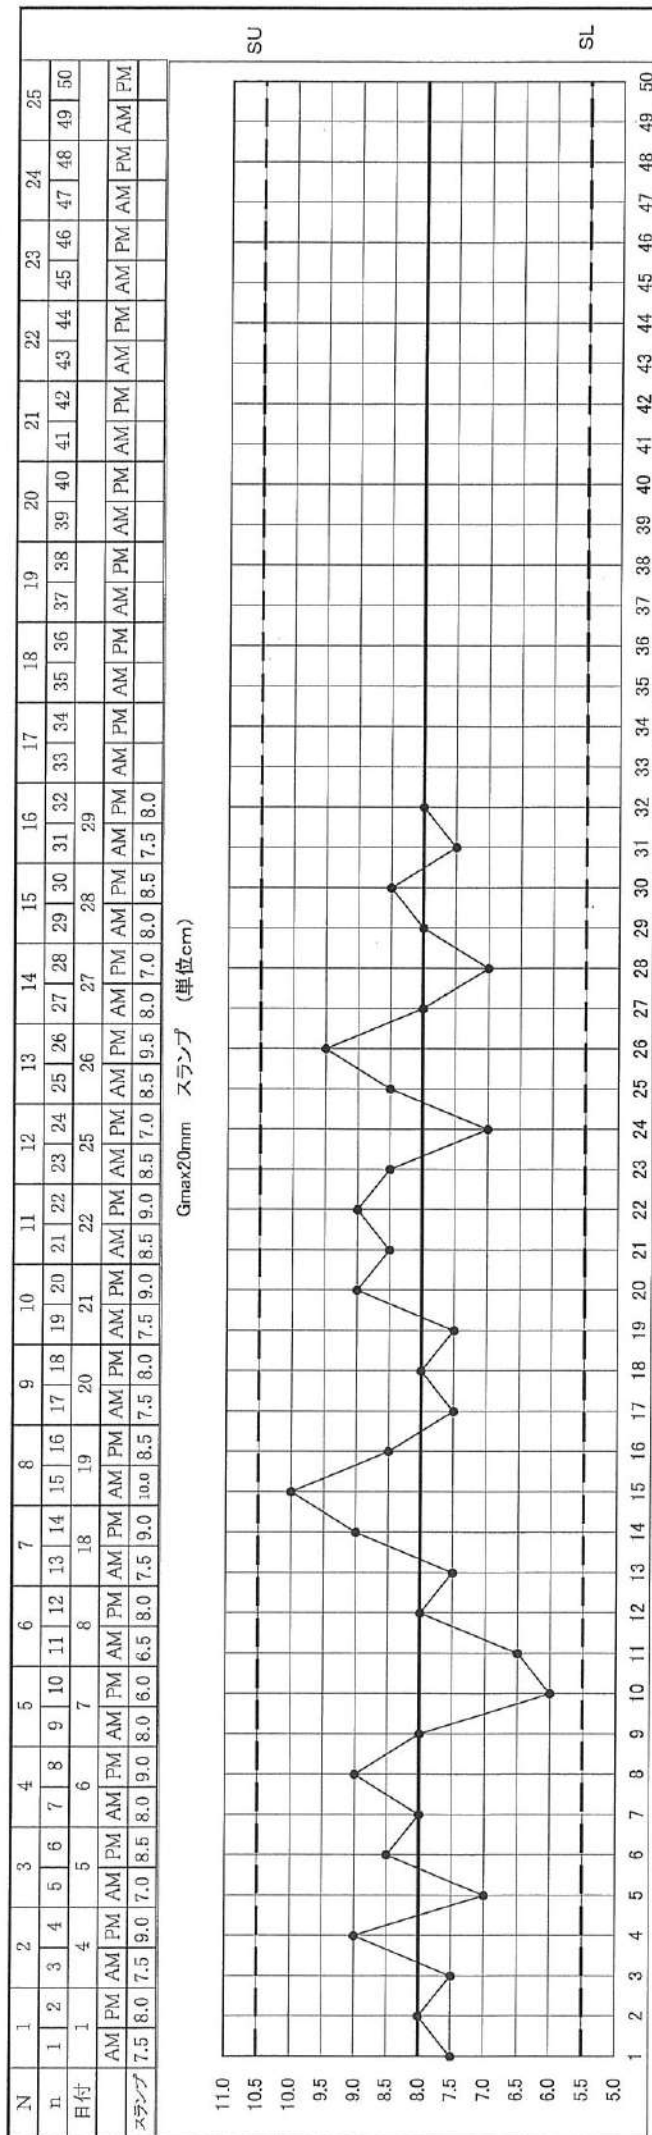

規格値	8.0±2.5cm
ロットサイズN	16
サンプルサイズn	32
最大値	10.0
最小値	6.0
区間の幅h	0.5
〇番区間の中心値 XO	8.0
Σf	32
Σfu	4
Σfu²	94

- 平均値(X) $X = XO + \Sigma fu / \Sigma f \times h$ = 8.06
- 標準偏差(S) $S = h \times \sqrt{1 / \Sigma f - 1 \{ \Sigma fu^2 - (\Sigma fu)^2 / \Sigma f \}}$ = 0.87
- 工程能力指数(Cp) $Cp = SU - SL / 6 \times S$ = 0.96
- 不良の割合
- 上限規格から外れる割合 $u = SU - X / S$ = 2.81 (K%)
- 下限規格から外れる割合 $u = X - SL / S$ = 2.95 (K%)
- 全体の不良の割合 $P = PU + PL$ = 0.41 (%)

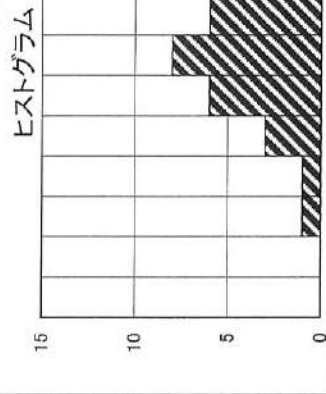

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
スランプ値	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0
f	0	0	1	1	3	6	8	6	5	1	1	0	0
u			-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4		
fu			-4	-3	-6	-6	0	6	10	3	4		
fu²			16	9	12	6	0	6	20	9	16		

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場

田中コンクリート工業(株) 東北工場

コンクリート中の塩化物イオン(Cl⁻)量測定記録

令和 7 年 8 月度

測定日 8 月 22 日 (金)

工場長	QCM	係
		

1 配合 (示方配合による) 配合の種類 スラグ

粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ の範囲 (cm)	空気量 の範囲 (%)	水セメント 比 (%)	細骨材率 (%)	単位量 (kg/m ³)					
					水 W	セメント C	細骨材 S1	スラグ S2	粗骨材 G	混和剤 AE
20	8±2.5	4.5±1.5	43.5	38.5	157	361	508	187	1145	1.81
セメントの種類		普通ポルトランドセメント								
混和剤の種類		AE減水剤 標準型 1種								
測定器名		カンタブ コ塩測第860202号 低濃度品 (Lot.754084) 有効期限 2026.8 ✓								



No.1

No.2

No.3



原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場

測定結果		
	カンタブの 読み	塩素イオン (%)
No.1	4.8	0.0298
No.2	4.4	0.0242
No.3	5.0	0.0329
平均値		0.0290
コンクリート中の塩 化物含有量		0.045 ✓

測定結果の判定	コンクリート中の塩化 物含有量	判定基準値	判定
	0.045 ✓ kg/m ³		
	≤	0.3 kg/m ³	合格

6. 試験機公正証明書

- ①. 圧縮強度試験機
- ②. 外圧強度試験機
- ③. トレーサビリティ体系

材料試験機校正証明書


田中コンクリート工業 株式会社
東北工場 殿

本報告書所載の材料試験機は、JIS B 7721に定める各規定によって
校正を行い、同規格に適合している事を証明します。

山形県酒田市 一18

株式会社

計量士



名称及び型式：圧縮試験機 アムスラー式 油圧 堅型

レンジ：1000kN (500. 250. 100)

製造者：(株)東京試験機製作所

製造番号：20575-1

製造年月：昭和48年8月

設置場所：秋田県大館市二井田字菖蒲沼28

田中コンクリート工業 株式会社 東北工場 内

校正年月日：自 2025年7月8日

有効期間：至 2026年7月

精度等級：

レンジ	等級	使用範囲の下限	レンジ	等級	使用範囲の下限
100kN	1	20kN	1000kN	1	200kN
250kN	1	50kN			
500kN	1	100kN			

荷重校正器：

型式	能力	器物番号	証明書番号	等級	校正年月日 有効期限
ロードセル	200kN	ADM180621	G240201	0.5	2024年12月11日 2026年12月10日
ロードセル	1000kN	ADM140297	G240202	1	2024年12月13日 2026年12月12日

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場

(1) 上記器物の校正結果は別紙成績書通りである。

(2) 校正に用いた力計は、(社)日本計量振興協会校正センターにて
定期的に校正されているものを使用。

(3) 精度等級は、JIS B 7721 表2に基づいて行った。

工場長	QCM	係

工場長	QCM	係
		

No. 7-7-13(3)

加 圧 板 成 績 書

2025年7月8日


製造番号 20575-1

検査員 佐藤 史綱

I. 平面度 単位 (μm)

II. 硬度 単位 (HRC)


上 部

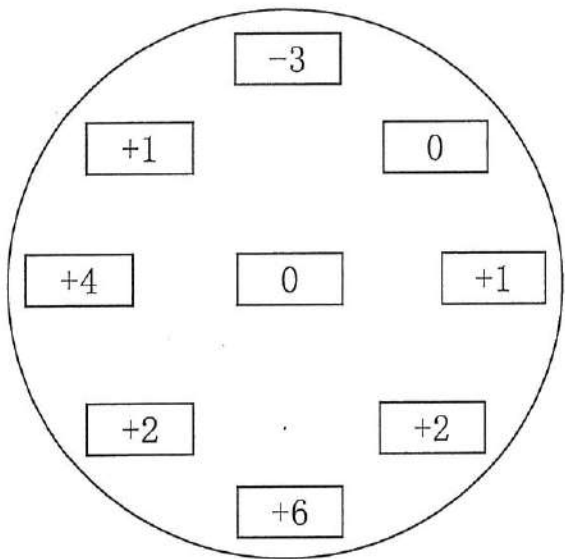


加圧板	硬度
上部	47
下部	48

下 部

φ 10cm用

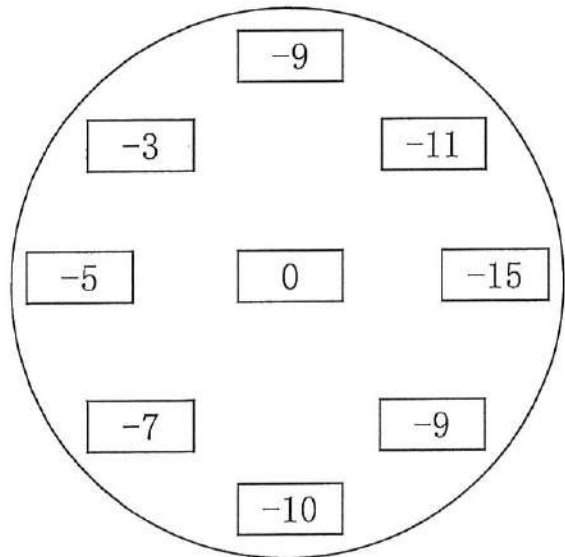

φ 12.5cm用

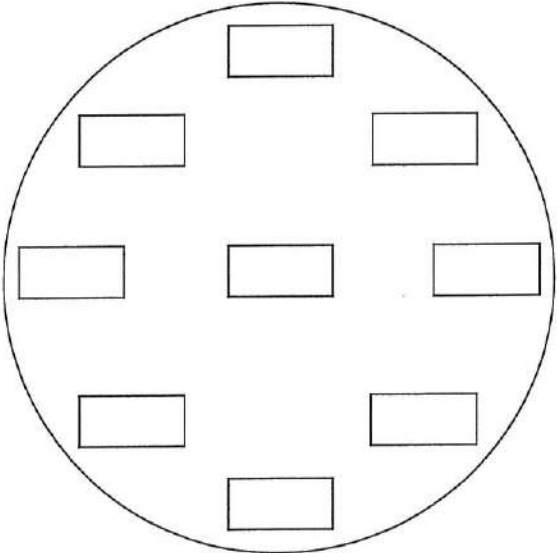

備考: 本検査(上・下部 加圧板)に使用した測定器

1. ハードスコープ J T トーシ(株) No.13295

2. 平面度検査器 榊杉本試験機製作所 No.30818

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場

工場長	QCM	係

圧縮試験機校正前データ

田中コンクリート工業株式会社
東北工場 殿

2025年7月8日

製造番号 20575-1

校正温度 30.0℃

レンジ (目量) kN	試験力 (kN)	力計の 指示値 (kN)	測定実荷重		
			荷重増加 (kN)	器差 (%)	ゼロ戻り (%)
100kN (0.1)	20	20.001	20.163	-0.81	0.000
	40	40.001	40.147	-0.37	↑
	60	60.001	60.215	-0.36	
	80	80.001	80.211	-0.26	
	100	100.000	100.194	-0.19	
250kN (0.25)	50	50.001	49.853	0.30	0.000
	100	100.002	99.526	0.48	↑
	150	150.003	149.443	0.37	
	200	200.002	199.422	0.29	
	250	250.004	249.136	0.35	
500kN (0.5)	100	100.002	99.557	0.45	0.000
	200	200.006	199.026	0.49	↑
	300	301.012	299.465	0.51	
	400	400.012	397.760	0.56	
	500	500.015	497.220	0.56	
1000kN (1)	200	200.005	199.031	0.49	0.000
	400	400.004	398.528	0.37	↑
	600	600.009	597.837	0.36	
	800	800.008	797.520	0.31	
	1000	1000.009	996.809	0.32	

※ 検査最大許容値 相対指示誤差(±1%) 良

株式会社 田中コンクリート工業株式会社
東北工場

計量士 竹田 和彦

原本と相違ない事を証明します
田中コンクリート工業(株)
東北工場


工場長	QCM	係
		

材料試験機校正証明書

田中コンクリート工業 株式会社
東北工場 殿

本報告書所載の材料試験機は、JIS B 7721に定める各規定によって
校正を行い、同規格に適合している事を証明します。

山形県酒田 7-18
株式会社
計量士



名称及び型式： 曲げ試験機 アムスラー式 油圧 堅型

レンジ： 250kN (100 . 50)

製造者： (株)東京試験機製作所

製造番号： 20575-2

製造年月： 昭和48年8月

設置場所： 秋田県大館市二井田字菖蒲沼28

田中コンクリート工業 株式会社 東北工場 内

校正年月日： 自 2025年7月8日

有効期間： 至 2026年7月

精度等級：

レンジ	等級	使用範囲の下限	レンジ	等級	使用範囲の下限
50kN	1	10kN			
100kN	1	20kN			
250kN	1	50kN			

荷重校正器：

型式	能力	器物番号	証明書番号	等級	校正年月日 有効期限
ロードセル	200kN	ADM180621	G240201	0.5	2024年12月11日 2026年12月10日
ロードセル	1000kN	ADM140297	G240202	1	2024年12月13日 2026年12月12日

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場

(1) 上記器物の校正結果は別紙成績書通りである。

(2) 校正に用いた力計は、(社)日本計量振興協会校正センターにて
定期的に校正されているものを使用。

(3) 精度等級は、JIS B 7721 表2に基づいて行った。



工場長	QCM	係
		

曲げ試験機校正前データ

田中コンクリート工業株式会社
東北工場 殿

2025年7月8日

製造番号 20575-2

校正温度 30.0℃

レンジ (目量) kN	試験力 (kN)	力計の 指示値 (kN)	測定実荷重		
			荷重増加 (kN)	器差 (%)	ゼロ戻り (%)
50kN (0.05)	10	10.000	10.007	-0.07	0.000
	20	20.001	20.086	-0.43	↑
	30	30.000	30.019	-0.07	
	40	40.000	39.985	0.04	
	50	49.999	49.971	0.06	
100kN (0.2)	20	20.000	20.033	-0.17	0.000
	40	40.000	39.986	0.04	↑
	60	60.000	60.050	-0.08	
	80	80.000	80.020	-0.03	
	100	100.000	100.085	-0.09	
250kN (0.25)	50	50.000	49.913	0.17	0.000
	100	100.001	100.116	-0.12	↑
	150	150.000	149.973	0.02	
	200	200.002	200.422	-0.21	
	250	250.001	250.056	-0.02	

※ 検査最大許容値 相対指示誤差(±1%) 良

株式会社 田中計装

計量士 竹田 和彦

原本と相違ない事を証明します

田中コンクリート工業(株)

東北工場

工場長	QCM	係
		

質量計・力計・長さ計 トレーサビリティ体系図

